


第16回旧RD最終処分場問題連絡協議会


工事の進捗状況と
平成28年度のスケジュールについて

平成28年6月27日

平成27年度の進捗状況

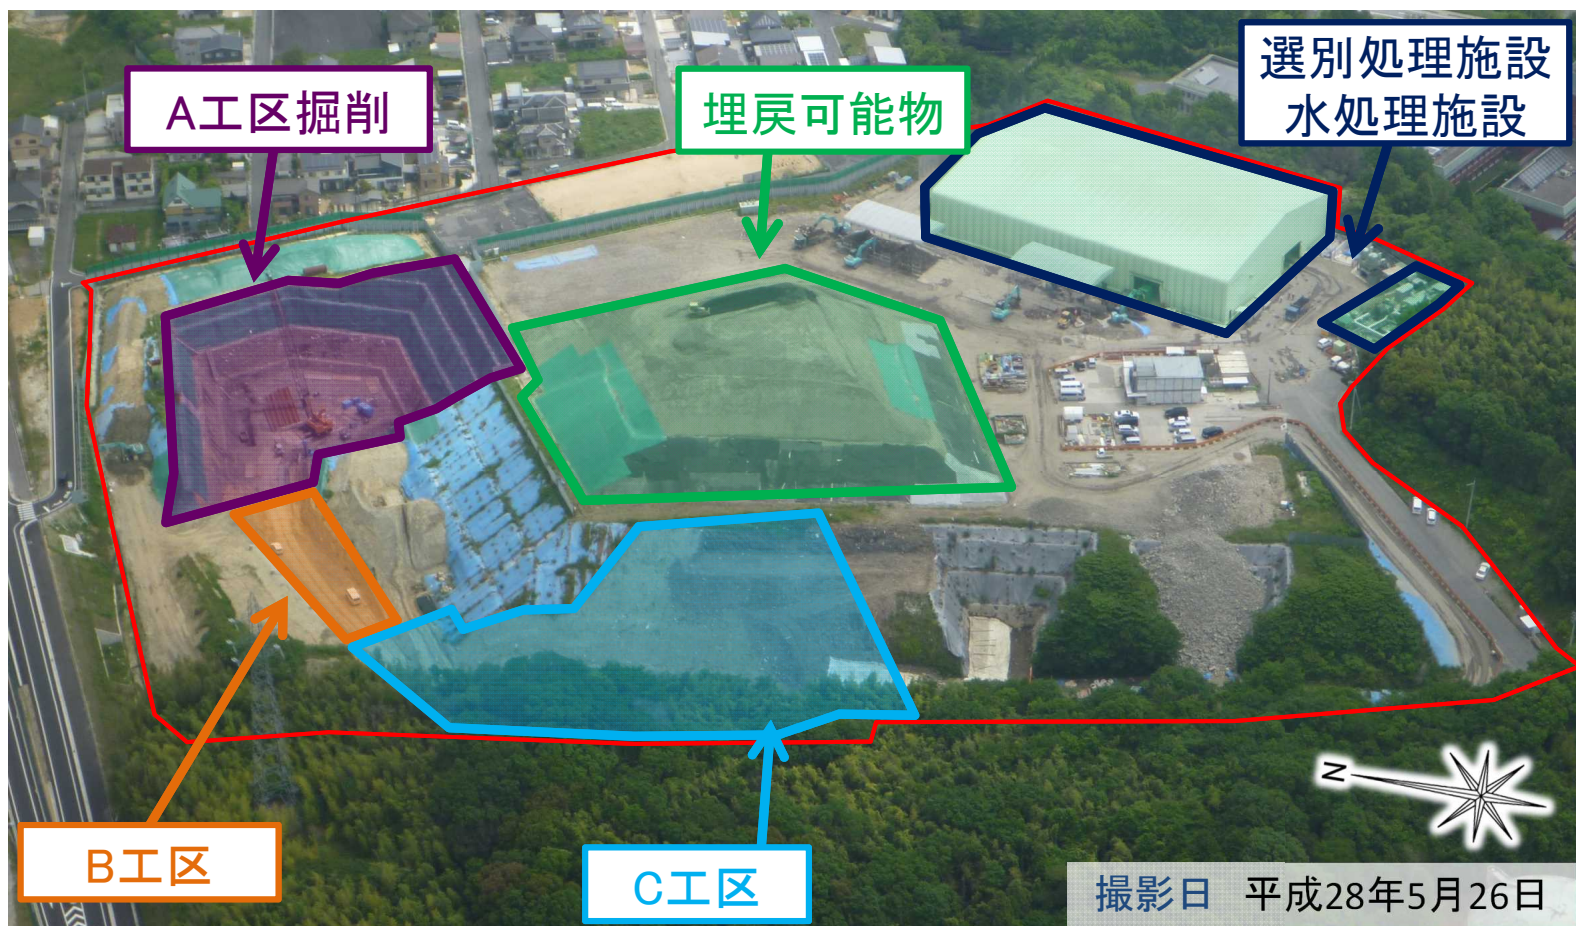

廃棄物土掘削(A工区)の状況

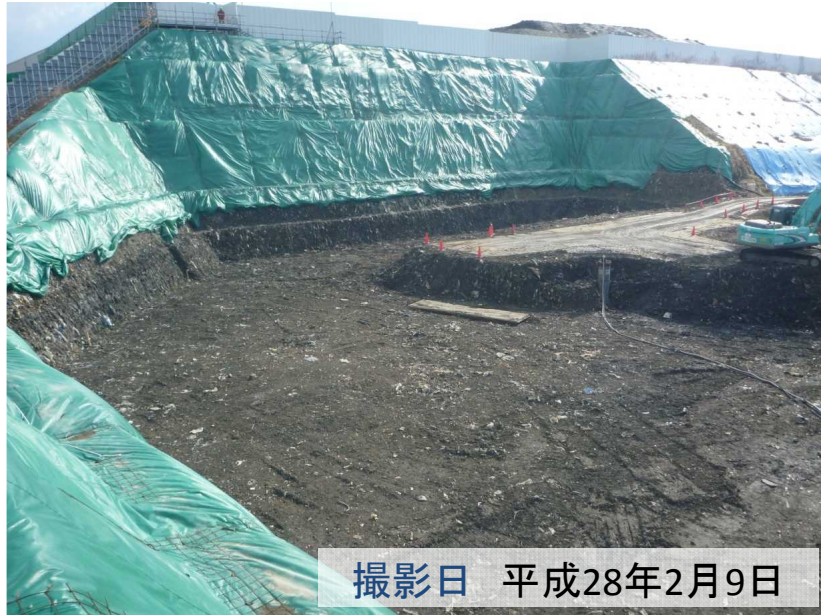

撮影日 平成28年2月9日

進捗状況

- ・ EL=130.5mまで掘削完了
EL: Elevation Level (標高)



撮影日 平成28年3月29日

廃棄物土掘削(B工区)の状況




撮影日 平成28年3月2日

進捗状況

- ・ A工区掘削の進捗に伴い進入路を造成

廃棄物土掘削(C工区)の状況

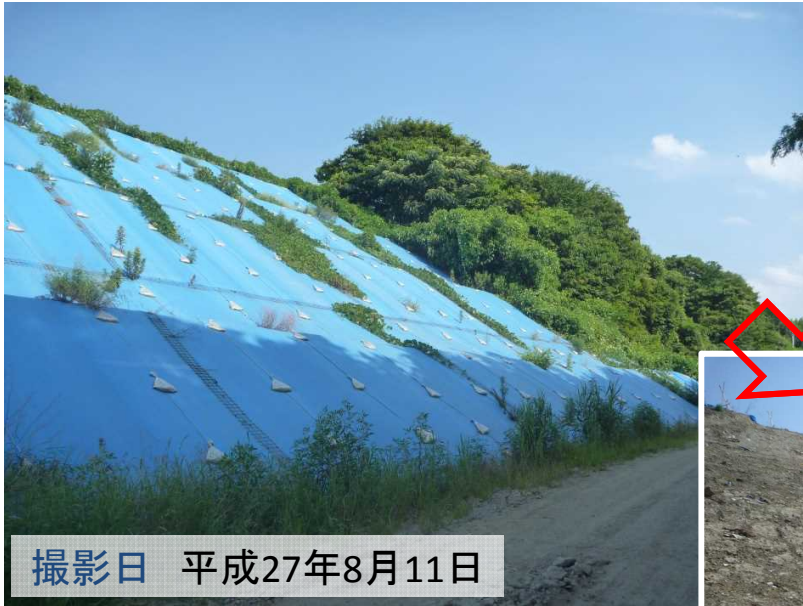

進捗状況

- ・ 掘削に向け準備
- ・ ブルーシートの撤去
- ・ 雑木の伐採

下流部止水矢板工・既設井戸撤去工

既設井戸撤去

下流部止水矢板工

撮影日 平成28年5月26日

下流部止水矢板工



撮影日 平成27年10月20日




撮影日 平成27年12月18日

進捗状況

- ・ 平面延長L=118.8m打設
- ・ 打設枚数 297枚

6

既設井戸撤去工

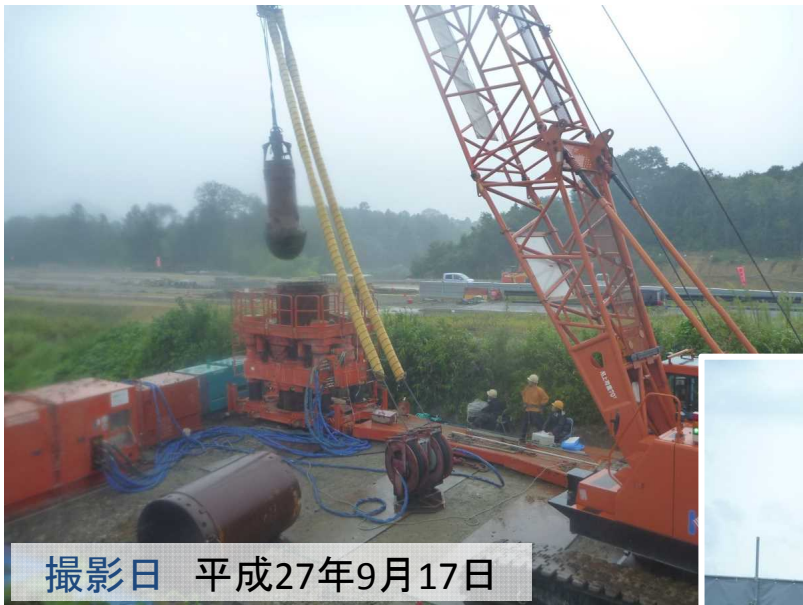

撮影日 平成27年9月17日



撮影日 平成27年9月24日

進捗状況

- ・ 全旋回掘削工法
- ・ B-2、No.9(新)の2本撤去

7

平成28年度のスケジュールについて

	平成28年度												平成29年度	
	4月 15 30	5月 15 31	6月 15 30	7月 15 31	8月 15 31	9月 15 30	10月 15 31	11月 15 30	12月 15 31	H29.1月 15 31	2月 15 28	3月 15 31		
二次対策工事 平成25年度～平成32年度	廃棄物土選別工												-----	
	廃棄物土掘削工												-----	
	底面止水矢板工		底面遮水工				浸透水貯留層工		底面止水矢板工					
	詳細調査ボーリング (B工区)													
産業廃棄物運搬処分委託	選別処理工程から発生する廃棄物の運搬・処分												-----	
	ドラム缶等の廃棄物の運搬・処分（発生した場合に限る）												-----	
旧RD最終処分場問題 連絡協議会(※)			第16回開催		第17回開催		第18回開催		第19回開催					
周辺環境モニタリング			第1回モニタリング		第2回モニタリング		第3回モニタリング		第4回モニタリング					

※ 新たに課題が生じた場合など必要に応じて連絡協議会を追加開催いたします。
