


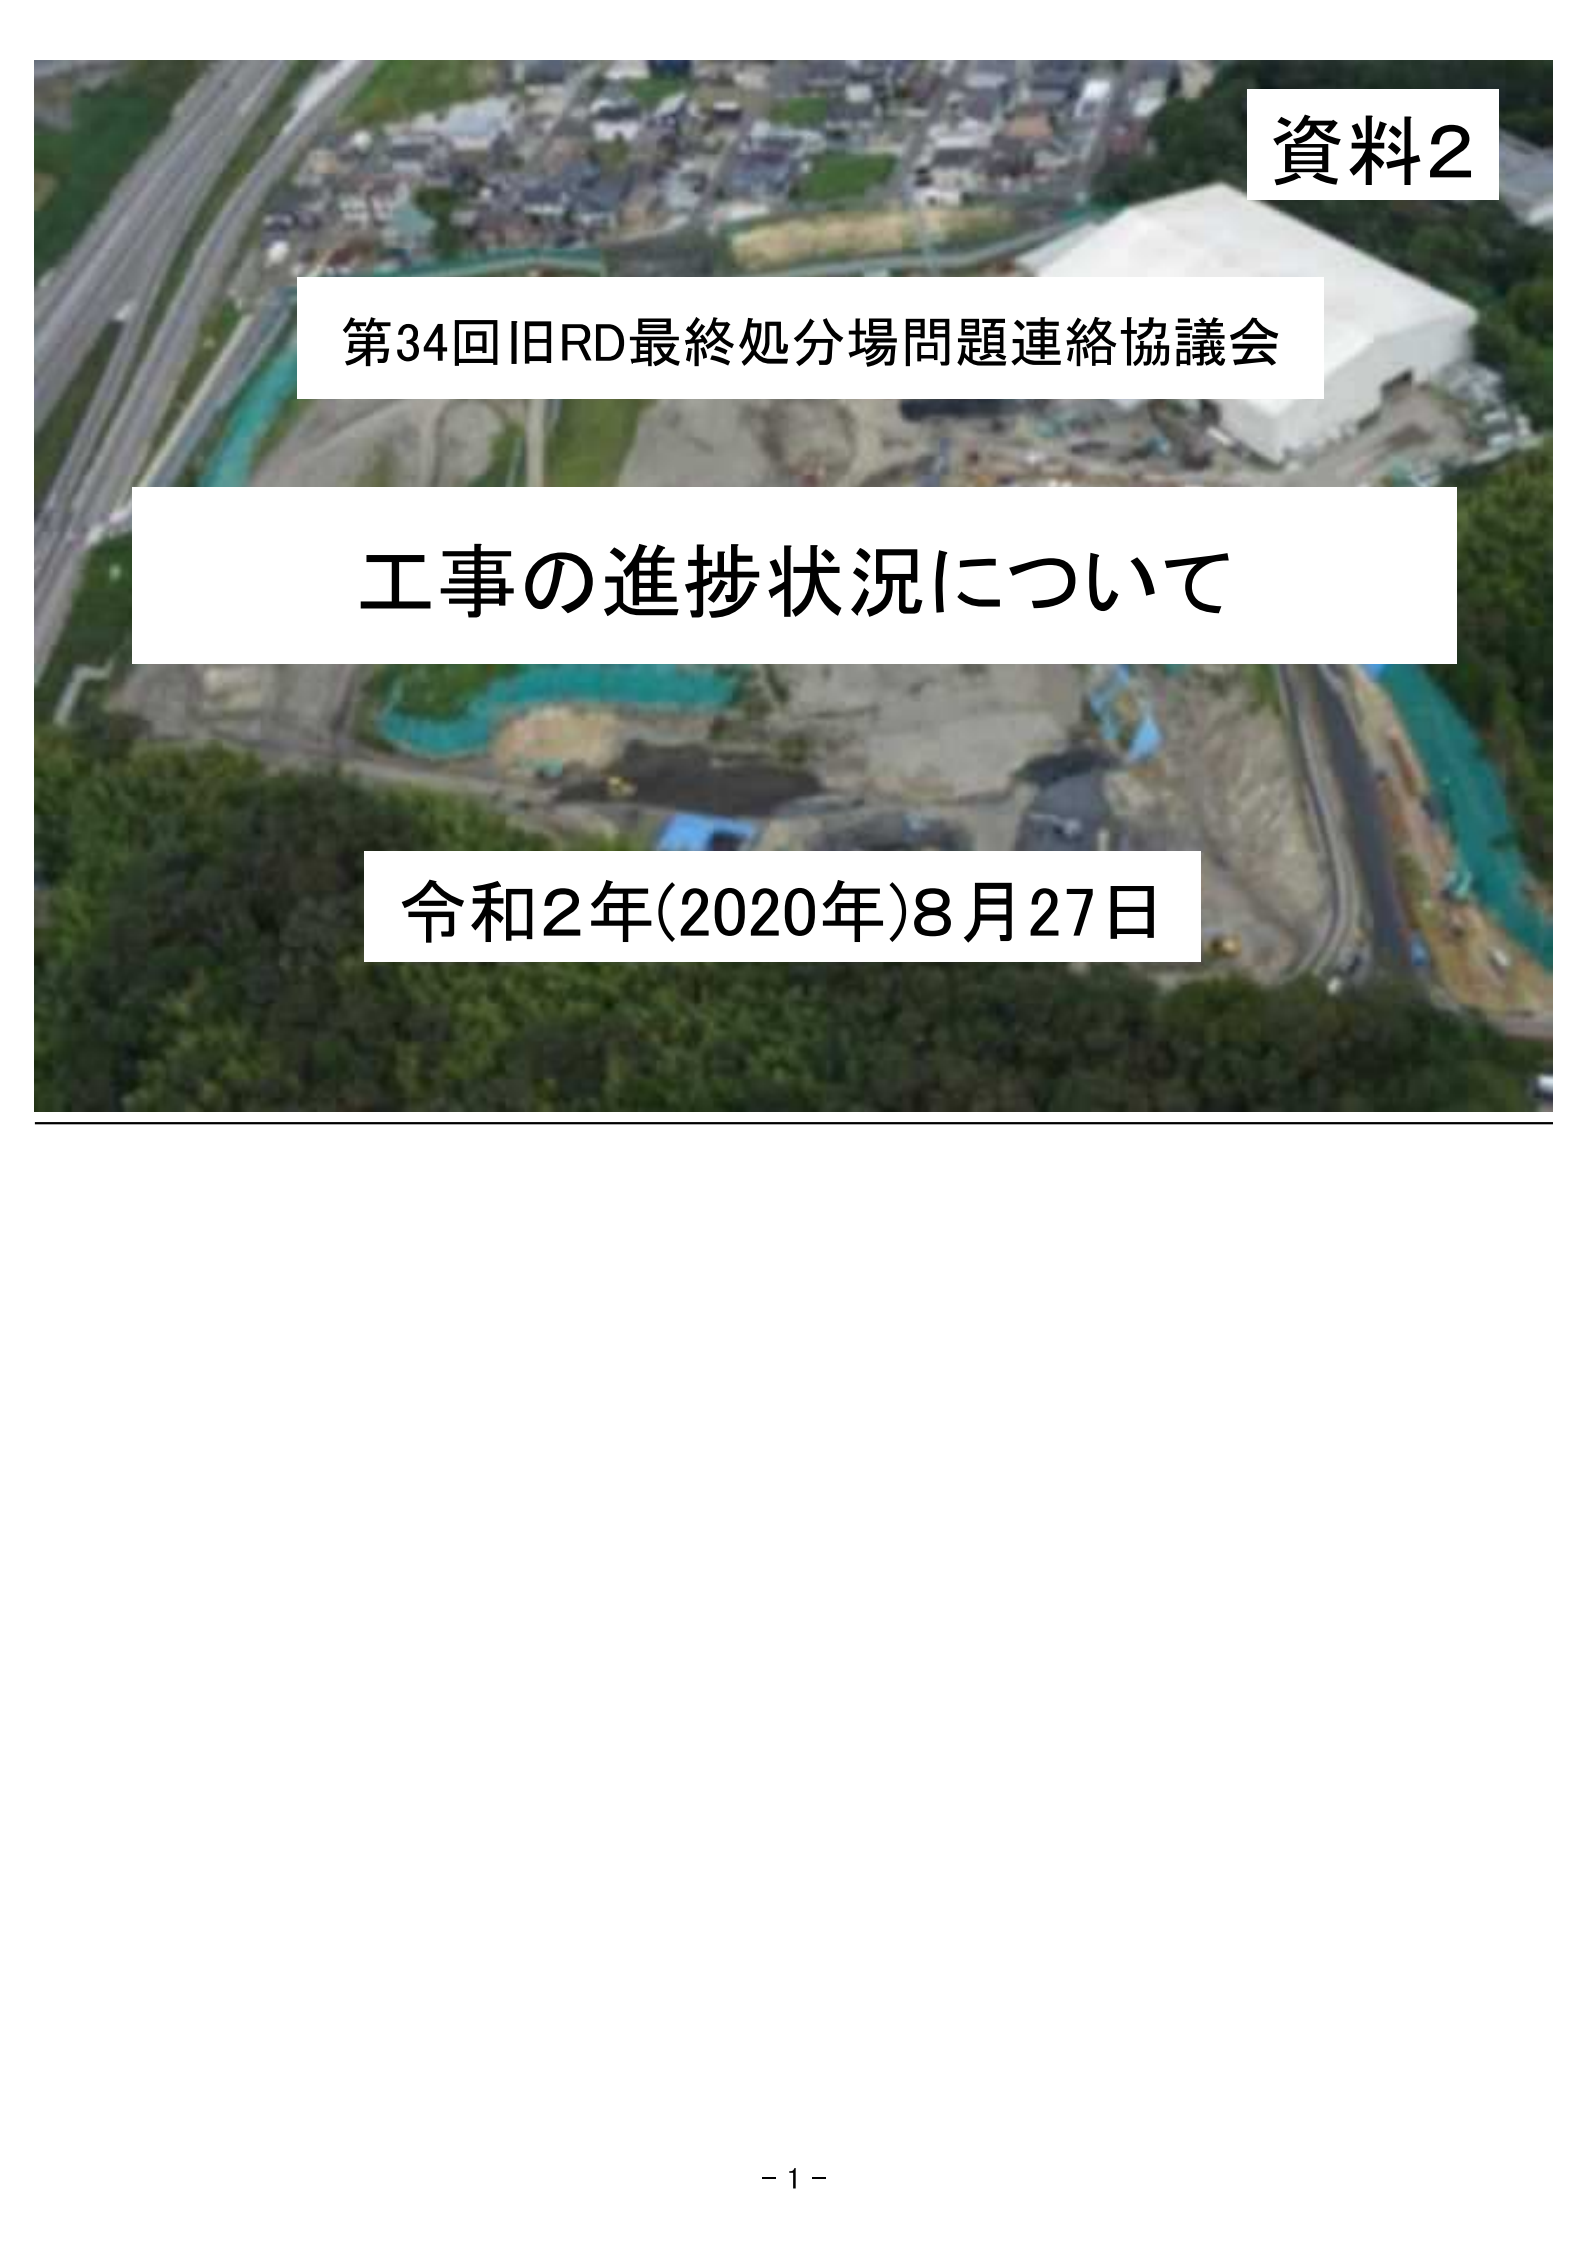


資料2

第34回旧RD最終処分場問題連絡協議会

工事の進捗状況について

令和2年(2020年)8月27日



令和2年度 工程表(案)

工 種	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		R3.1月		2月		3月	
	15	30	15	31	15	30	15	31	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31	15	31	15	28	15	31
選別処理施設	解体撤去																							
選別土盛土																								
工事用進入路復旧工									電柱移設		進入路盛土等													
キャッピング工	法面部覆土				平面部覆土										シート張									
	旧シート撤去				モルタル吹付																			
舗装工											場内側・市道部舗装										進入路舗装			
洪水調整設備工	セメント改良土				シート張、張コン																			
雨水排水工																								
フェンス工	万能塀撤去				万能塀撤去																			
後片付け等	第33回 連絡協議会(書面)				第34回 連絡協議会(8/27)										(契約工期 ~R3.3.25) 後片付け・書類整理 検査									

※現時点の工程であり、天候や作業状況等により変更が生じる場合があります。 _ 2 _

A工区の状況

進捗状況

- ・仮置き選別土のすきとり、覆土や排水側溝の整備を実施

- 写真 ① 選別土すきとり状況
② 排水側溝整備状況
③ 覆土の法面整形状況



撮影日 令和2年(2020年)6月12日

①



撮影日 令和2年(2020年)5月15日

②



撮影日 令和2年(2020年)7月2日

③

B工区の状況

進捗状況

- ・覆土の法面整形や排水側溝の整備を実施
- ・洪水調整設備工の整備を実施

- 写真 ① 覆土の法面整形状況
② 排水側溝整備状況
③ 洪水調整設備工の整備状況



撮影日 令和2年(2020年)6月4日

①



撮影日 令和2年(2020年)7月2日

②



撮影日 令和2年(2020年)8月4日

③

CD工区の状況

進捗状況

- ・排水側溝やキャッピングシートの整備を実施

- 写真 ① 排水側溝設置状況
② キャッピングシート整備状況



撮影日 令和2年(2020年)7月2日

①



撮影日 令和2年(2020年)8月3日

②

E工区の状況

進捗状況

- ・排水側溝や覆土の法面整形の整備を実施

- 写真 ① 排水側溝整備状況
② 西市道の盛土状況
③ 覆土の法面整形状況



撮影日 令和2年(2020年)5月14日

①



撮影日 令和2年(2020年)6月29日

②



撮影日 令和2年(2020年)6月29日

③

平面部の施工状況

進捗状況

- ・ 選別土の積込・敷均し状況



平面部の施工状況

進捗状況

- ・ 覆土の敷均し状況




覆土の施工状況

進捗状況


- ・法面部の覆土施工後の基準高、勾配の確認を実施

- 写真 ① 測線No.9 2段目
② 測線No.7 3段目 (1:2.0)

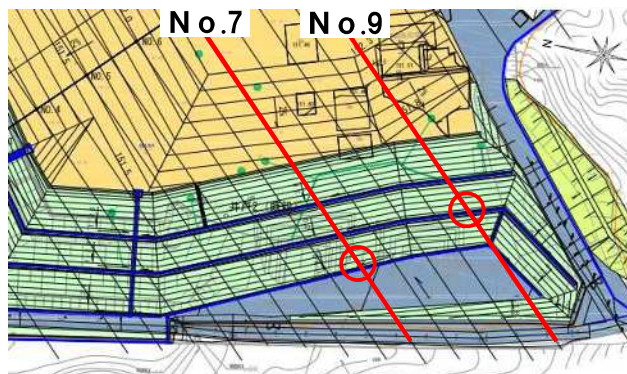

撮影日 令和2年(2020年)6月9日

①

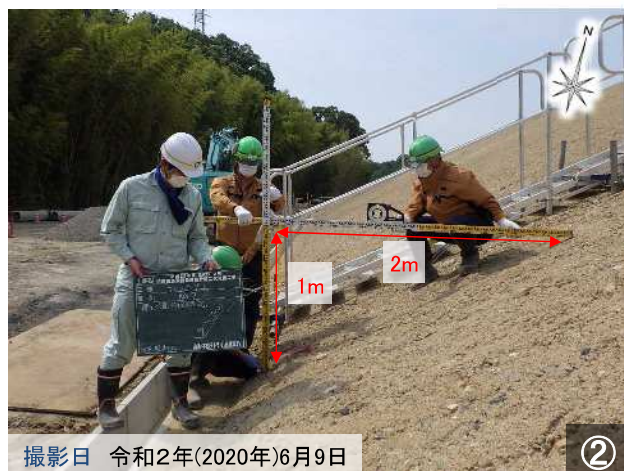

撮影日 令和2年(2020年)6月9日


②

覆土の施工状況

進捗状況

- ・法面部の覆土厚(50cm以上)の確認を実施

- 写真 ① 測線No.7 1段目 (51cm)
② 測線No.9 1段目 (52cm)

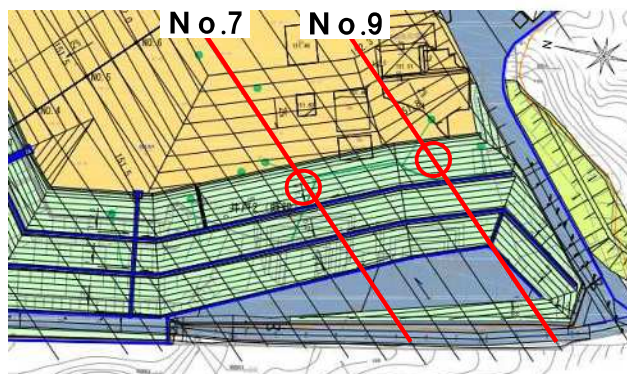

撮影日 令和2年(2020年)1月21日

①



撮影日 令和2年(2020年)4月14日

②

北尾団地広場側の状況

進捗状況

・シートの撤去・除草、ラス金網の設置、モルタル吹付を実施

写真 ① シート撤去・除草状況
② ラス金網の設置状況
③ モルタル吹付施工状況



撮影日 令和2年(2020年)5月12日

①



撮影日 令和2年(2020年)6月5日

②




撮影日 令和2年(2020年)8月4日

③

水処理施設の地盤調査

第32回連絡協議会(R2.2.13)
における質問対応

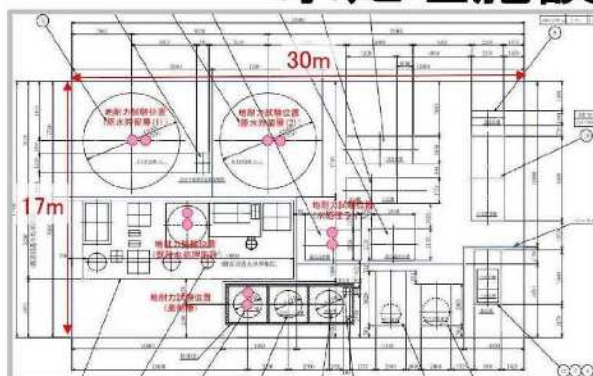

撮影日 平成26年(2014年)7月3日

①

測点		許容支持力 (kN/m ²)	設計支持力 (kN/m ²)
原水貯留槽(1)	①	45.3	52.7
	②	60.0	
原水貯留槽(2)	①	101.6	100.0
	②	98.3	
水処理ライン	①	125.5	119.7
	②	113.8	
薬剤槽	①	160.0	145.1
	②	130.1	
既設水処理施設	①	120.0	115.9
	②	111.8	



撮影日 平成26年(2014年)3月6日

②
