

# DE工区の状況




撮影日 平成29年7月31日



撮影日 平成30年5月28日

## 廃棄物土掘削(DE工区)の状況

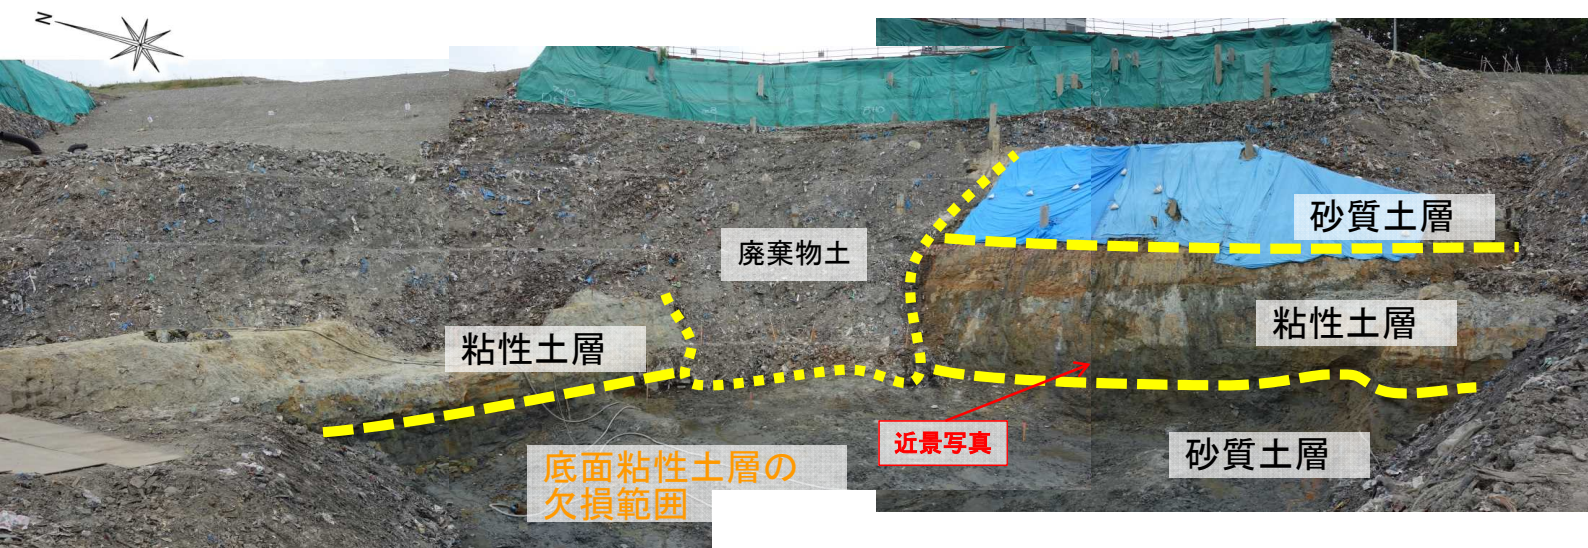


撮影日 平成30年5月29日

### 現在の状況

- ・ DE工区東側の計画掘削ラインでの廃棄物土掘削は完了しましたが、中央部の幅約10m範囲では、廃棄物土が一部残存しているため、追加調査を行い、掘削方法の検討を行います。
- ・ 上下流側では底面粘性土層が層厚約2～6m程度で厚く分布。  
→掘削底面は掘り止め。基盤材の埋戻しを行う。



# 地質状況

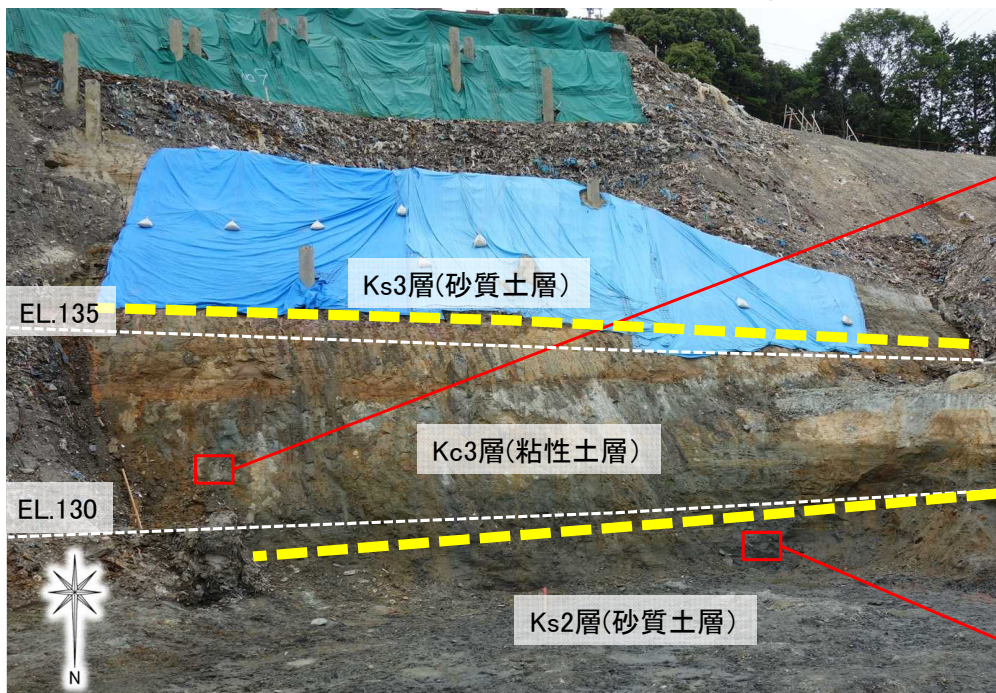

Kc3層(粘性土層)  
 細粒で固結度が高く  
 割れ目等は認められない



Ks2層(砂質土層)  
 砂分を主体とし  
 Kc3層と比較して固結度は低い

撮影日 平成30年5月29日

## 現場見学会の開催

(DE工区)

### 概要

・DE工区(東側)の掘削後の地山状況について開催



### 開催結果

開催日:平成30年6月1日  
 参加者:10名



### 次回見学会

・工事の進捗に応じてDE工区掘削状況等で開催予定
