

《旧RD最終処分場 一次対策工事 工事情報 をお知らせいたします。》

平成24年 11月9日作成


週間工程		施工実績(先週)							施工予定(今週)							施工予定(来週)							備考	
		平成24年11月																						
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
日付		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
工種・作業内容																								
廃棄物土掘削工	Aエリア																						現場見学会 (予定)	
	Bエリア																							
	Cエリア																							
	Dエリア																							
廃棄物土仮置場工	廃棄物土移動	廃棄物土移動					休	休													休	11/7完了		
浸透水揚水工	揚水井戸 掘削			No.1重機搬入～井戸掘削					No.1用重機搬出													11/15完了予定 (No.1揚水井戸)		
	揚水井戸 設備								No.2・No.1井戸設備設置													11月下旬完了予定		
							工	工													工			

【お知らせ連絡】

- ・11/15から掘削作業を開始予定です。(工事の進捗状況により工程は変わる可能性があります。)
- ・掘削現場見学会の日程は、来週の工事情報にてお知らせします。(24日ごろを予定しています)

【工事施工状況写真】

[平成24年11月9日現在 全景]

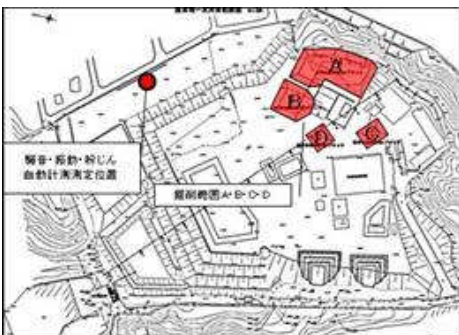

騒音・振動・粉じんの測定は掘削開始時から掲載します

