

# 《旧RD最終処分場 一次対策工事 工事情報 をお知らせいたします。》

平成24年 11月2日作成


週間工程		施工実績(先週)							施工予定(今週)							施工予定(来週)							備考
日付 工種・作業内容		平成24年10月							11月														
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
		29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
廃棄物土掘削工	Aエリア																						11月下旬完了予定 12月下旬完了予定
	Bエリア																						
	Cエリア																						
	Dエリア																						
廃棄物土仮置場工	廃棄物土移動						休	廃棄物土移動						休	休							休	11/7完了予定
前処理ヤード工	前処理ヤード施設の構築																						11/1完了 (撤去作業あり)
キャッピング工	掘削範囲A・B・C・D 掘削前キャッピングシート敷設	通気性シート丸太押さえ												工	工							工	11/1完了 (遮水シートあり)
浸透水揚水工	揚水井戸 掘削			No.2用重機搬出							No.1重機搬入～井戸掘削						No.1用重機搬出						11/15完了予定 (No.1揚水井戸)
	揚水井戸 設備			No.2井戸設備設置													No.1井戸設備設置						11月下旬完了予定 (No.1揚水井戸)

### 【お知らせ連絡】

- ・11/15から掘削作業を開始予定です。(工事の進捗状況により工程は変わる可能性があります。)
- ・「一次対策工事情報」と「工事かわら版」は、滋賀県最終処分場特別対策室のホームページに掲載しています。

### 【工事施工状況写真】

[平成24年11月1日現在 全景]

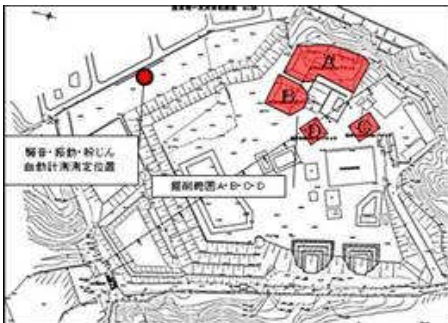

騒音・振動・粉じんの測定は掘削開始時から掲載します

