

《旧RD最終処分場 一次対策工事 工事情報 をお知らせいたします。》

平成24年 10月26日作成


週間工程		施工実績(先週)							施工予定(今週)							施工予定(来週)							備考	
		平成24年10月														11月								
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
工種・作業内容	日付	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
場内通路工	草刈・不陸整正・敷鉄板敷	敷鉄板敷並べ							敷鉄板敷並べ							敷鉄板敷並べ							11/9完了予定	
廃棄物土仮置場工	廃棄物土仮置場準備・廃棄物土移動	廃棄物土移動							休	廃棄物土移動						休							休	10/30完了予定
前処理ヤード工	前処理ヤード施設の構築																							10/31完了予定 (撤去作業あり)
キャッピング工	掘削範囲A・B・C・D 掘削前キャッピングシート敷設								工							工							工	10/25完了 (遮水シートあり)
環境対策工	防塵設備仮囲い設置 洗車設備構築								洗車場構築							入口部仮囲い設置								11/3完了予定
浸透水揚水工	揚水井戸掘削								No.2用重機搬出							No.1重機搬入～井戸掘削								11月中旬完了予定 (No.1揚水井戸)
	揚水井戸設備								No.2井戸設備設置															11月下旬完了予定 (No.1揚水井戸)

【お知らせ連絡】

・請負業者の清水建設(株)より工事情報紙「工事かわら版」が月末に発行されます。裏面に月間工程表が掲載されますのでご参考にしてください。なお、工事の進捗状況により工程は変わる可能性があります。
 ・「一次対策工事情報」と「工事かわら版」は、滋賀県最終処分場特別対策室のホームページに掲載します。

【工事施工状況写真】

[平成24年10月26日現在 全景]

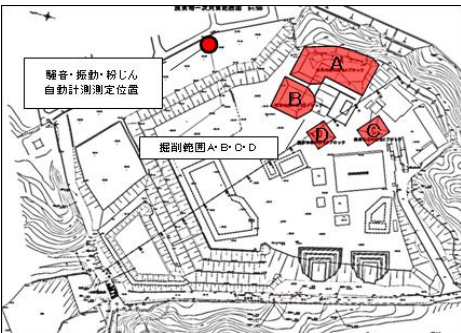

騒音・振動・粉じんの測定は掘削開始時から掲載します
