


《旧RD最終処分場 一次対策工事 工事情報 をお知らせいたします。》

平成24年 10月19日作成

週間工程		施工実績(先週)							施工予定(今週)							施工予定(来週)							備考				
		平成24年10月																						11月			
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
日付		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4					
工種・作業内容																											
場内通路工	草刈・不陸整正・敷鉄板敷								敷鉄板敷並べ							敷鉄板敷並べ							11/9完了予定				
廃棄物土仮置場工	廃棄物土仮置場準備・廃棄物土移動							休							休							休	10/30完了予定				
前処理ヤード工	前処理ヤード施設の構築																						10/30完了予定 (撤去作業あり)				
キャッピング工	掘削範囲A・B・C・D 掘削前キャッピングシート敷設							工			通気性シート設置				工							工	10/26完了予定				
環境対策工	防塵設備仮囲い設置 洗車設備構築							洗車場構築							入口部仮囲い設置								10/29完了予定				
浸透水揚水工	揚水井戸No. 1及びNo. 2構築			井戸掘削No.2設置							重機移動			井戸掘削No.1設置								11/9完了予定					
	No.1井戸工事用通路整備																						10/23完了予定 (撤去作業あり)				
構造物撤去工	既存洗車設備取壊し撤去																						完了				
【お知らせ連絡】																											

【工事施工状況写真】

[平成24年10月18日現在 全景]

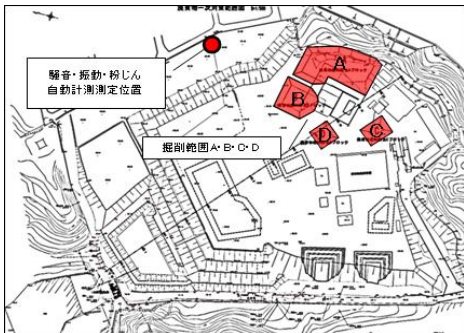

騒音・振動・粉じんの測定は掘削開始時から掲載します
