


# 《旧RD最終処分場 一次対策工事 工事情報 をお知らせいたします。》

平成24年 10月12日作成

週間工程		施工実績(先週)							施工予定(今週)							施工予定(来週)													
工種・作業内容		平成24年10月																											
		月8	火9	水10	木11	金12	土13	日14	月15	火16	水17	木18	金19	土20	日21	月22	火23	水24	木25	金26	土27	日28							
場内通路工	草刈・不陸整正・敷鉄板敷	敷鉄板敷並べ							敷鉄板敷並べ							敷鉄板敷並べ													
廃棄物土仮置場工	廃棄物土仮置場準備・土移動						休	休	シート敷並べ							休													休
									土移動																				
前処理ヤード工	前処理ヤード施設の構築			掘削床付		基礎コン			鉄筋組立							底版生コン打設													
									底版型枠組立							壁生コン打設													
キャッピング工	掘削範囲A・B・C・D 掘削前キャッピングシート敷設						工	工								工	壁型枠組立												
									通気性シート																				
環境対策工	防塵設備仮囲い設置 洗車設備構築			洗車場構築					洗車場構築							仮囲い設置													
				防臭ミスト設備設置																									
モニタリング設備工	モニタリング井戸設置			井戸掘削																									
浸透水揚水工	揚水井戸No. 1及びNo. 2構築								No.2							No.1													
									機械搬入組立 掘削							機械解体搬出													
構造物撤去工	既存洗車設備取壊し撤去	鋼構造物解体							鋼構造物解体																				
		コンクリート構造物解体							コンクリート構造物解体																				
仮設通路工	No.1井戸工用通路整備								盛土																				
									測量							敷鉄板													

【お知らせ連絡】  
・今週より揚水井戸の掘削を開始します。

【工事施工状況写真】  
[平成24年10月12日現在 全景]

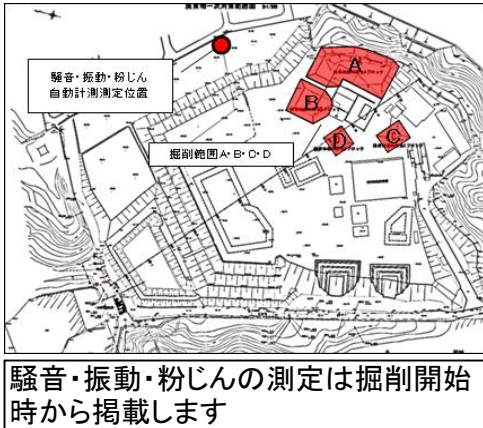

騒音・振動・粉じんの測定は掘削開始時から掲載します

