




資料1-2

旧最終処分場二次対策工事
平成26年度進捗および平成27年度予定

平成26年6月5日撮影

平成25年度RD-3号旧産業廃棄物最終処分場二次対策工事
【平成26年度工事実績平面図】

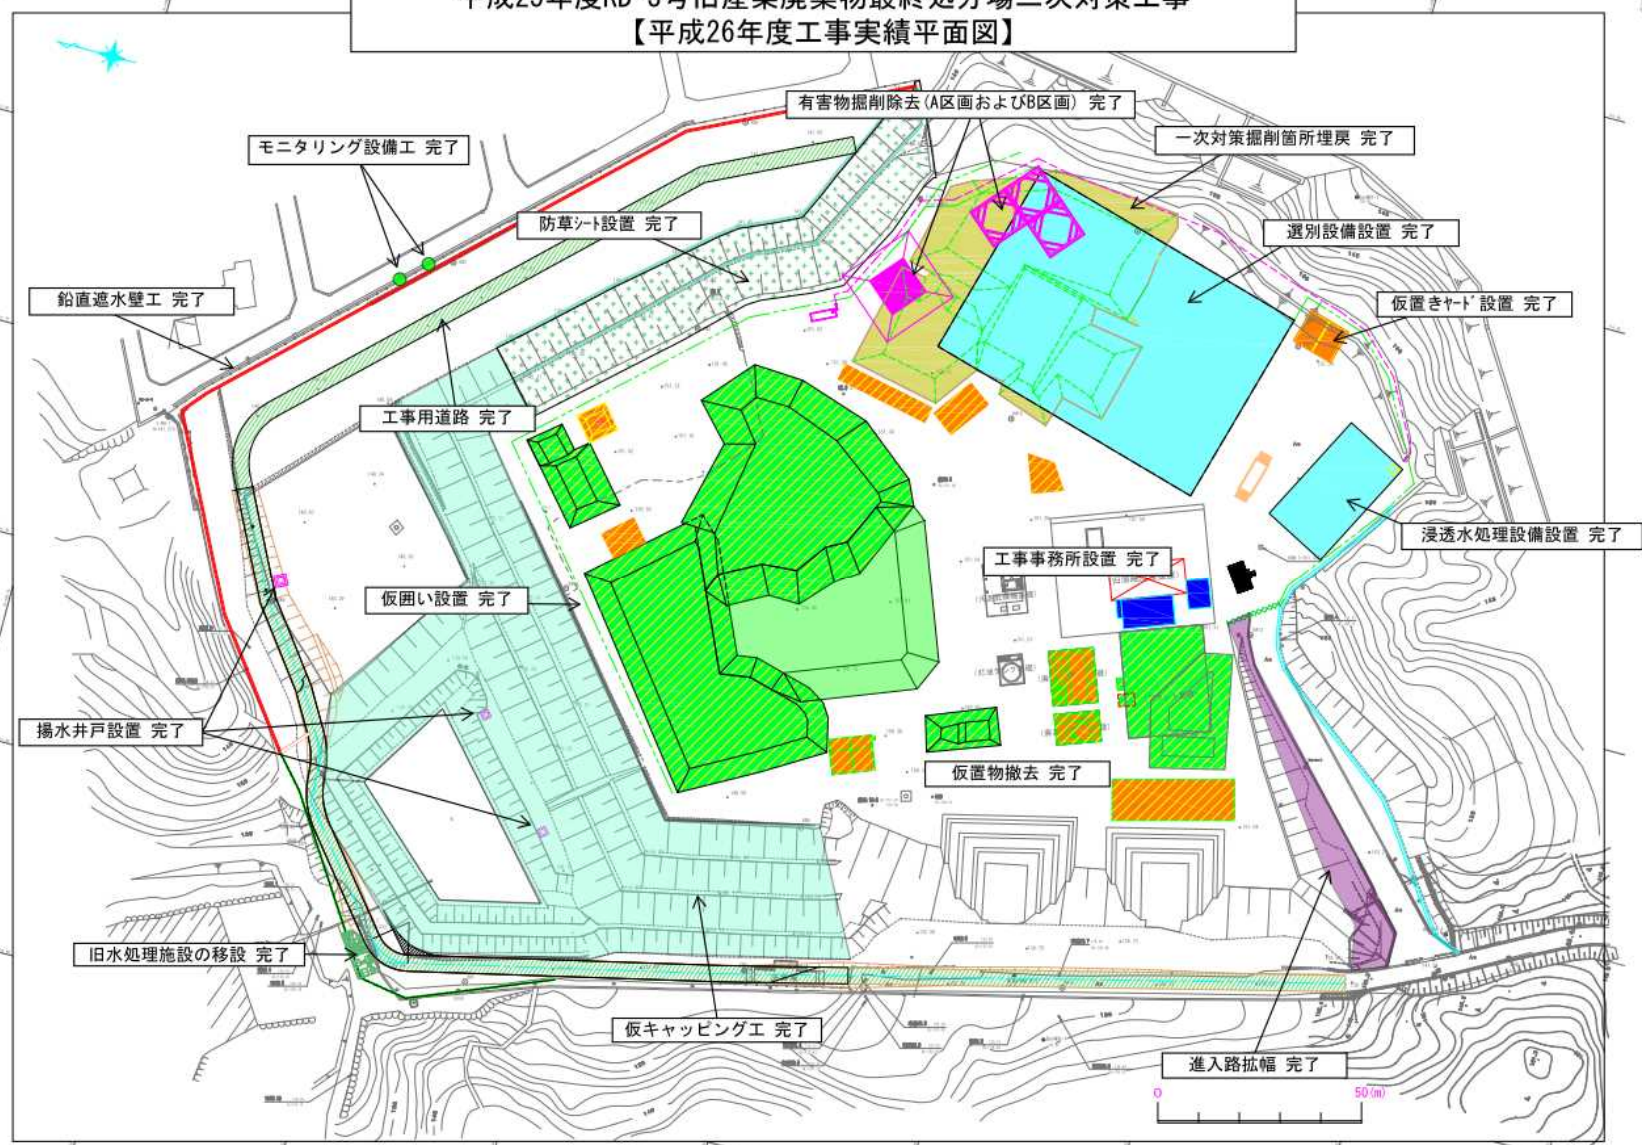



有害物掘削除去
A・B区画



掘削



廃棄物



埋戻










選別施設

平成25年度第RD-3号旧産業廃棄物最終処分場二次対策工事
【平成27年度工事予定箇所平面図】

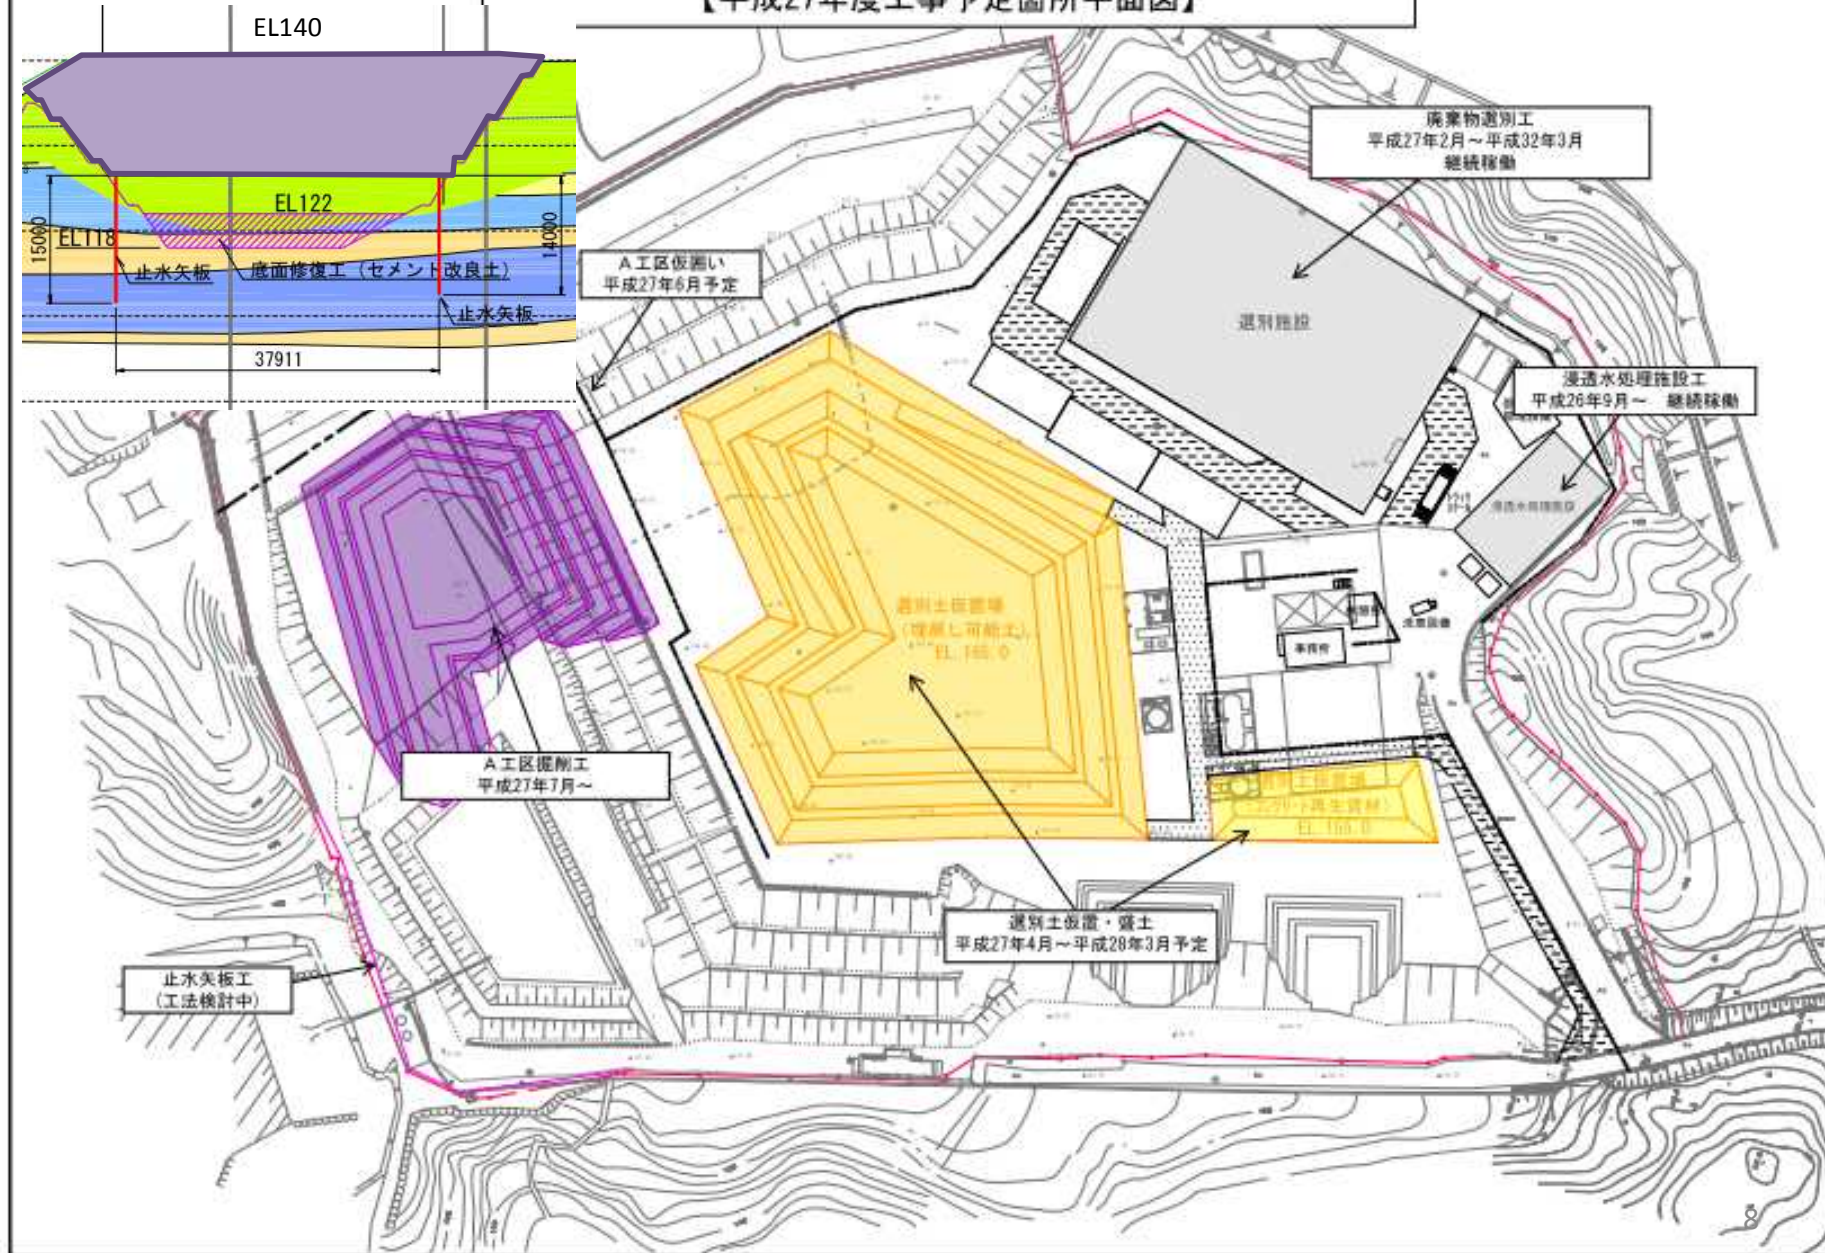

EL140

EL122

EL118

止水矢板

底面修復工(セメント改良土)

37911

A工区仮囲い
平成27年6月予定

廃棄物選別工
平成27年2月～平成32年3月
継続稼働

浸透水処理施設工
平成26年9月～ 継続稼働

選別施設

浸透水処理施設

A工区掘削工
平成27年7月～

選別土留置場
(埋戻し可前土)
EL.140.0

選別土留置・露土
平成27年4月～平成28年3月予定

止水矢板工
(工法検討中)

平成25年度第RD-3号旧産業廃棄物最終処分場二次対策工事
【平成27年度工程表】

・契約着工日 平成 年 月 日
・実着工日 平成 年 月 日
・当初竣工日 平成 年 月 日
・変更竣工日 平成 年 月 日

鴻池・不動テトラ・八田建設工事共同企業体

区分	工種	単 位	年 数	月 量	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		H28.1月		2月		3月		
					15	30	15	31	15	30	15	31	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31	15	31	15	31	15	28	15
	廃棄物土・有害物掘削工 仮置き物撤去工	式	1.0		仮置き物撤去工 23,000m ³ /200m ³ /日		約115日																						
	廃棄物土掘削工	式	1.0										A工区 止水矢板施工基面まで 50,000m ³ /220m ³ /日														約230日		
	有害物掘削除去工	式	1.0																										
	選別土仮置・盛土	式	1.0		選別土仮置き																								
	矢板工	式	1.0										検討中																
	環境対策設備設備工	式	1.0				A工区仮囲い																						
	仮設備工	式	1.0																										
	廃棄物選別工 選別処理施設	式	1.0		運転管理																								
	その他 既設井戸撤去	式	1.0																										
