

《旧RD最終処分場 一次対策工事 工事情報 をお知らせいたします。》

平成25年2月16日作成

| 週間工程 日付 | 施工実績(先週) | | | | | | | 施工予定(今週) | | | | | | | 施工予定(来週) | | | | | | 備考 | |
|------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|-------|---|----|-----------------|
| | | | | | | | | 2月 | | | | | | | 3月 | | | | | | | |
| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | 日 |
| 工種・作業内容 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | |
| A・B区画 | | | | | | | | | | | | | | | シート敷設 | | | | シート固定 | | | 2月下旬 シート敷設完了 |
| C・D区画 | | | | | | | 休 | | | | | | | 休 | 埋戻し | | | | | | 休 | 2月下旬 埋戻し完了予定 |
| 旧焼却炉跡 | | | | | | | | | | | | | | | シート敷設 | | | | シート固定 | | | 2月下旬 シート敷設完了 |
| その他コンクリート構造物取り壊し | | | | | | | 工 | | | | | | | 工 | 洗車設備取り壊し | | | | | | 工 | 2月下旬 取り壊し完了 |

【お知らせ連絡】

- ・先週お知らせしました2/23(土)の焼却炉基礎コンクリート撤去後の状況確認のための掘削現場見学会は中止します。なお、確認のための見学会は25年度に実施する二次対策工事にて行います。
- ・D追加区画(1,4-ジオキサン)の掘削は、悪天候のため作業に遅れが出ていますので見学をご希望の方は清水建設(TEL077-554-8287)まで連絡をお願いします。なお、話し合いで説明しましたとおり、作業スペースの関係で掘削完了後、直ちに埋戻します。

【工事施工状況写真】


[平成25年2月16日撮影]



D追加区画掘削状況



旧焼却炉跡撤去

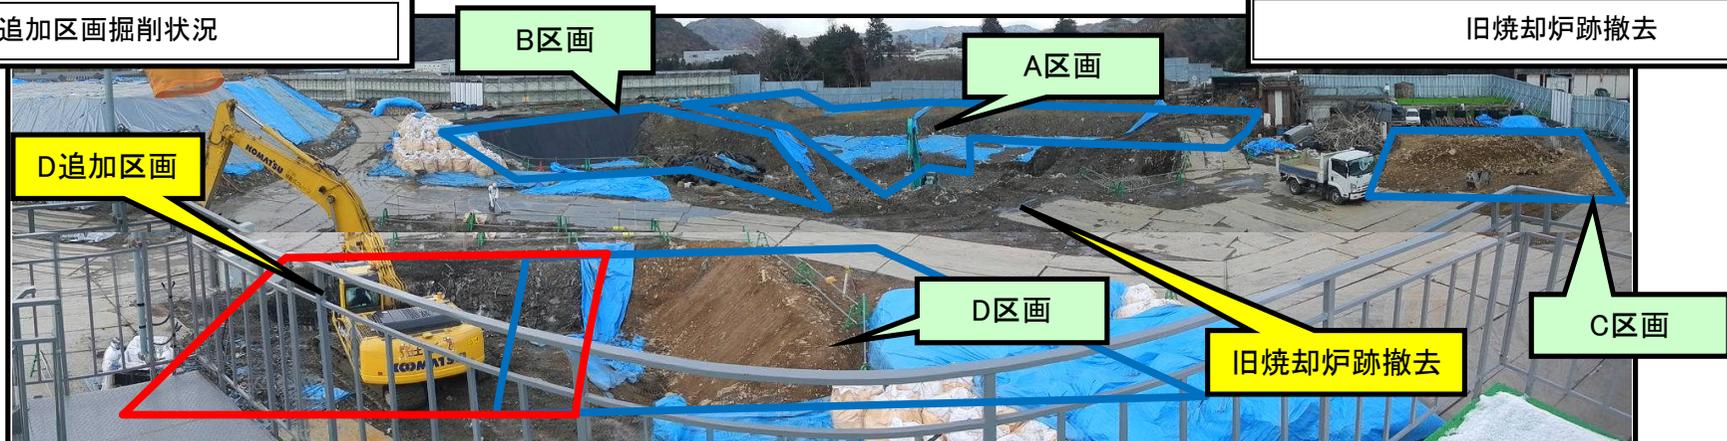


騒音・振動・粉じん自動計測の週間結果報告

【自動計測測定位置】

騒音・振動・粉じん自動計測測定は、旧RD敷地境界で行っています。

【自動計測測定位置平面図】

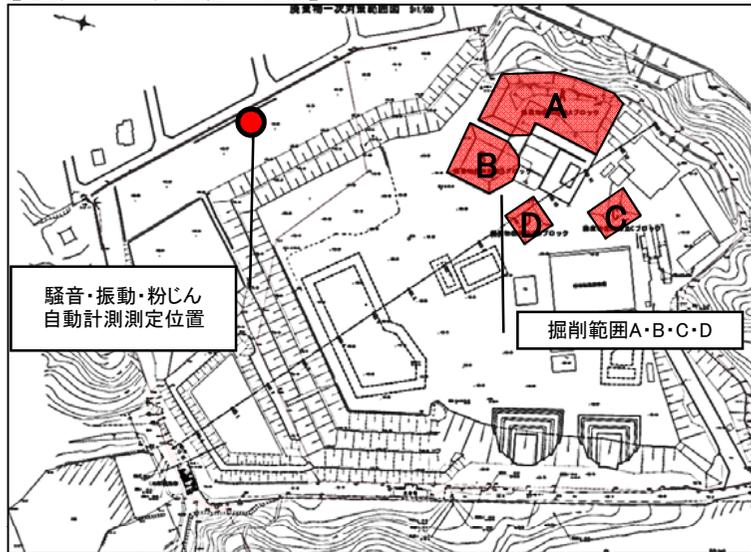

【測定値管理基準】

| | 騒音 | 振動 | 粉じん |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 第1管理値 | 基準値の90% | 基準値の90% | 基準値の90% |
| 第2管理値 | 基準値 | 基準値 | 基準値 |
| 基準値 | 85dB 栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準 | 75dB 栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準 | 0.20mg/m ³ 環境省『大気の大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準 |

【注意】(第1管理値を超過した場合)

作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行う。

【警報】(第2管理値を超過した場合)

直ちに作業を中止し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開する。

