




資料1-2

平成26年6月5日撮影

旧最終処分場二次対策工事
平成26年度進捗および平成27年度予定

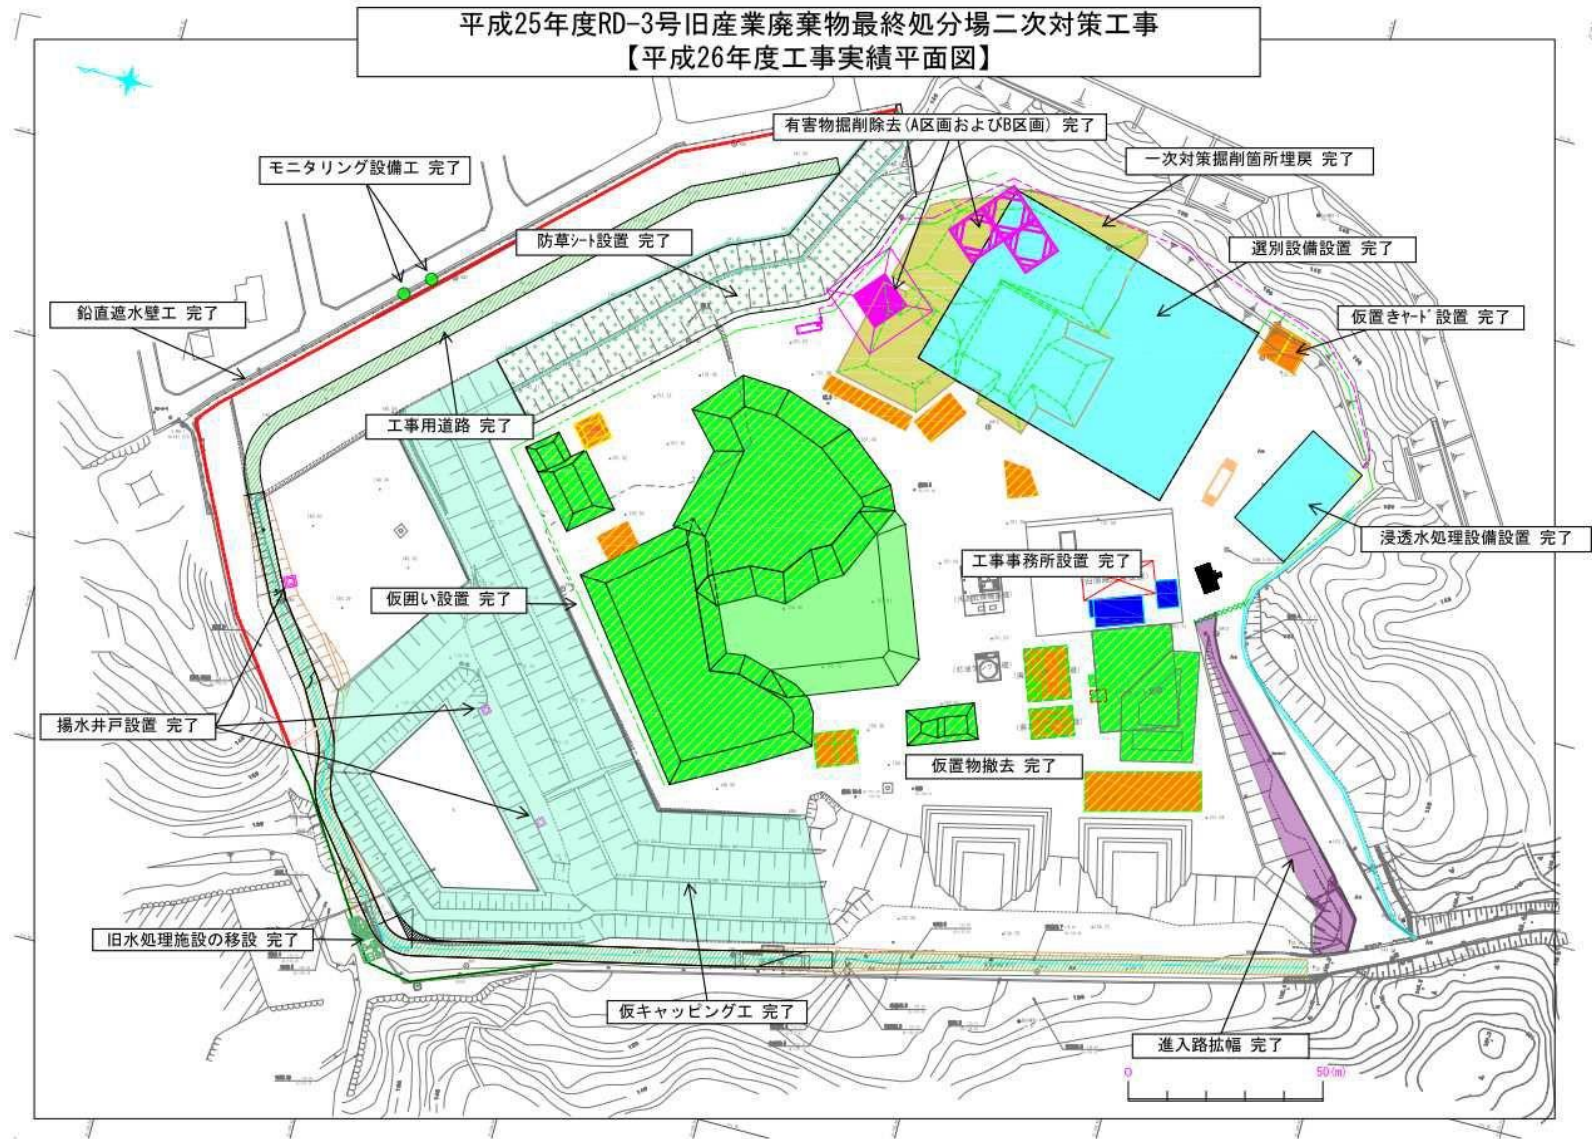








鉛直遮水壁 TRD工法

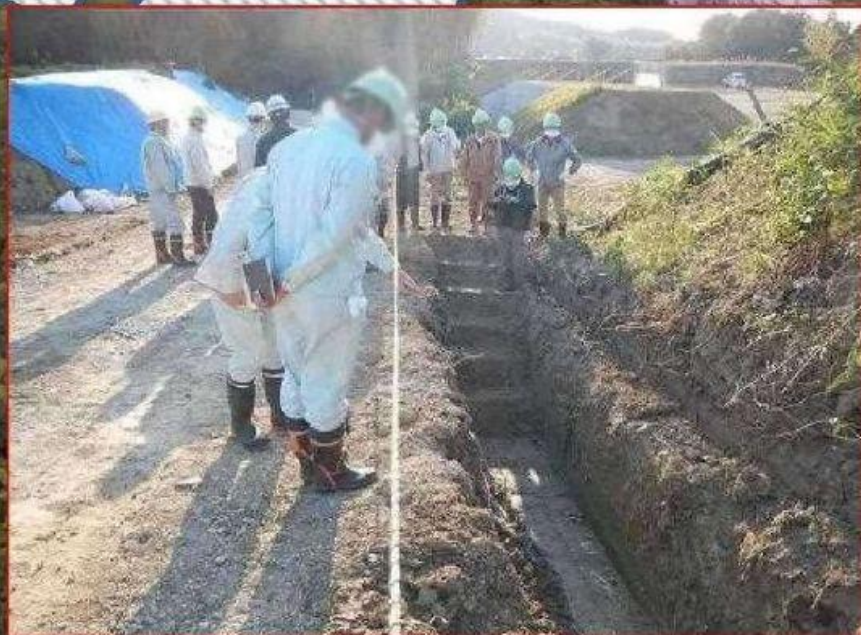



平成25年度第RD-3号旧産業廃棄物最終処分場二次対策工事

【平成27年度工程表】

・契約着工日 平成 年 月 日
 ・実着工日 平成 年 月 日
 ・当初竣工日 平成 年 月 日
 ・変更竣工日 平成 年 月 日

鴻池・不動テトラ・八田建設工事共同企業体

区分	工 種	単 位	年 数	月 量	4月 15 30	5月 15 31	6月 15 30	7月 15 31	8月 15 31	9月 15 30	10月 15 31	11月 15 30	12月 15 31	H28.1月 15 31	2月 15 28	3月 15 31
	廃棄物土・有害物掘削工 仮置き物撤去工	式	1.0		仮置き物撤去工 23,000m ³ /200m ³ /日 ㌦115日											
	廃棄物土掘削工	式	1.0						A工区 止水矢板施工基面まで 50,000m ³ /220m ³ /日 ㌦230日							
	有害物掘削除去工	式	1.0													
	選別土仮置・盛土	式	1.0						選別土仮置き							
	矢板工	式	1.0						検討中							
	環境対策設備設備工	式	1.0				A工区仮囲い									
	仮設備工	式	1.0													
	廃棄物選別工 選別処理施設	式	1.0						運転管理							
	その他 既設井戸撤去	式	1.0													
