

工事の進捗状況について

第14回旧RD最終処分場問題連絡協議会

平成27年12月22日

旧処分場全体航空写真



全景および作業状況



3

二次対策工事土工・処分実績(平成27年11月末現在)

項 目			数量	単位
仮置物撤去土量			21,300	m ³
A工区掘削土量			15,400	m ³
埋戻し可能物仮置土量			31,100	m ³
場外への搬出・処分量	廃棄物	可燃物(主に廃プラスチック類で木くず等が混じるもの)	3,300	t
		不燃物(ガラス陶磁器くず、金属くず)	180	t
		有害物(バッテリー、変圧器等)	3	t
	廃棄物 混じりの土	有害物(H26年度 A-1区画他)	2,800	t
		ドラム缶およびその内容物が浸潤した廃棄物土 医療系廃棄物混じり土	34	t
		鋭利なものを含む等、選別に適さない廃棄物土等	590	t
	選別土	ふっ素が土壌環境基準を超過したもの	3,000	t
	資源化	金属くず	97	t

4


平成27年度工程表

鴻池・不動テトラ・八田建設工事共同企業体

工 種	単 位	年 月	H27.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H28.1月	2月	3月
			15 31	15 28	15 31	15 30	15 31	15 30	15 31	15 31	15 30	15 31	15 30	15 31
廃棄物土・有害物掘削工 仮置き物撤去工	式	1.0	仮置き物撤去工 23,000m ³ / 200m ³ /日 ≒ 115日											
廃棄物土掘削工	式	1.0	A工区 止水矢板施工基面まで 50,000m ³ / 220m ³ /日 ≒ 230日											
有害物掘削除去工	式	1.0												
選別土仮置・盛土工	式	1.0	選別土仮置き											
矢板工	式	1.0	下流部止水矢板工											
環境対策設備工	式	1.0	A工区仮囲い											
廃棄物選別工 廃棄物選別工	式	1.0	運転管理											
その他 既設井戸撤去	式	1.0	No.B-2、No.9(新)											


5

廃棄物土掘削(A工区他)の概要

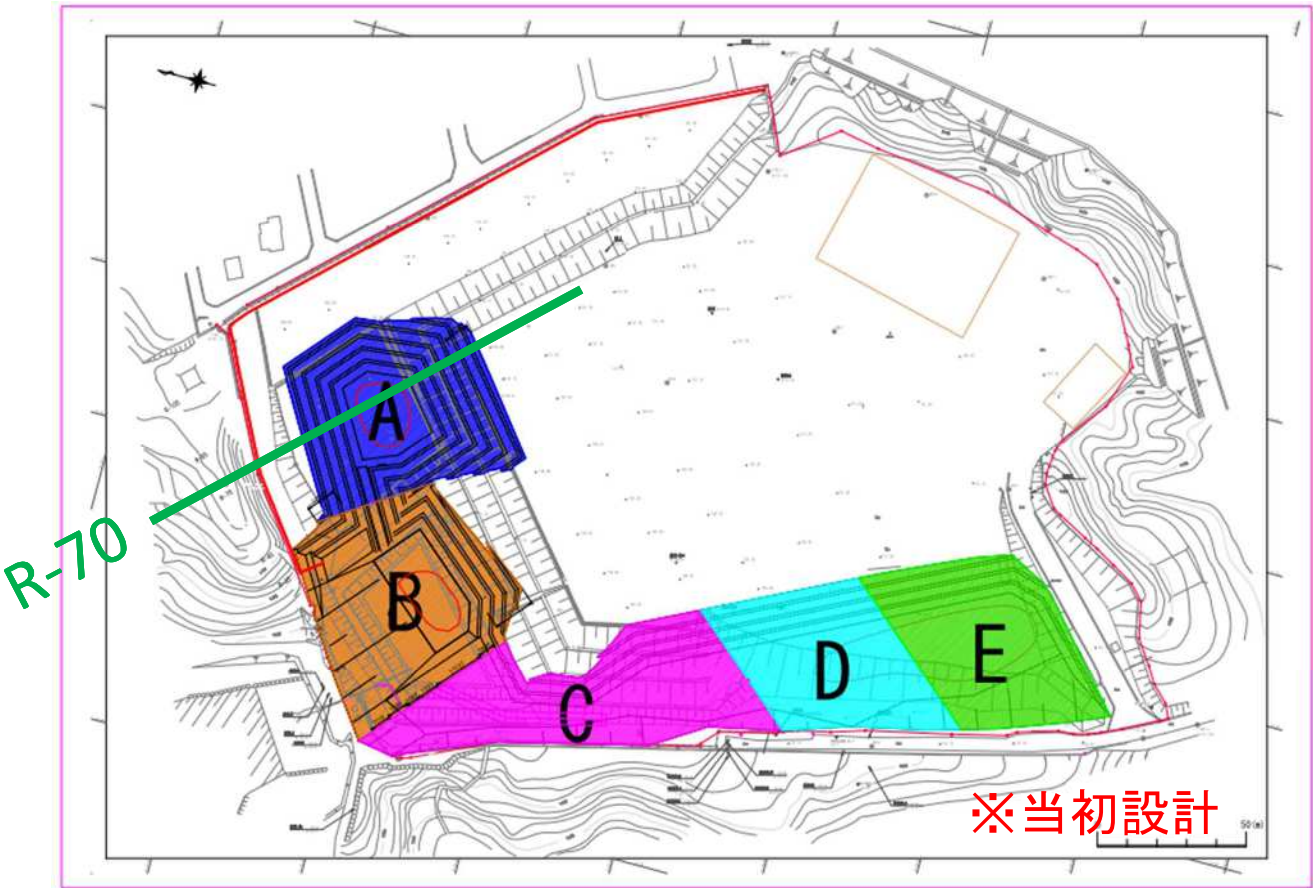


6

A工区廃棄物土掘削・盛土作業1

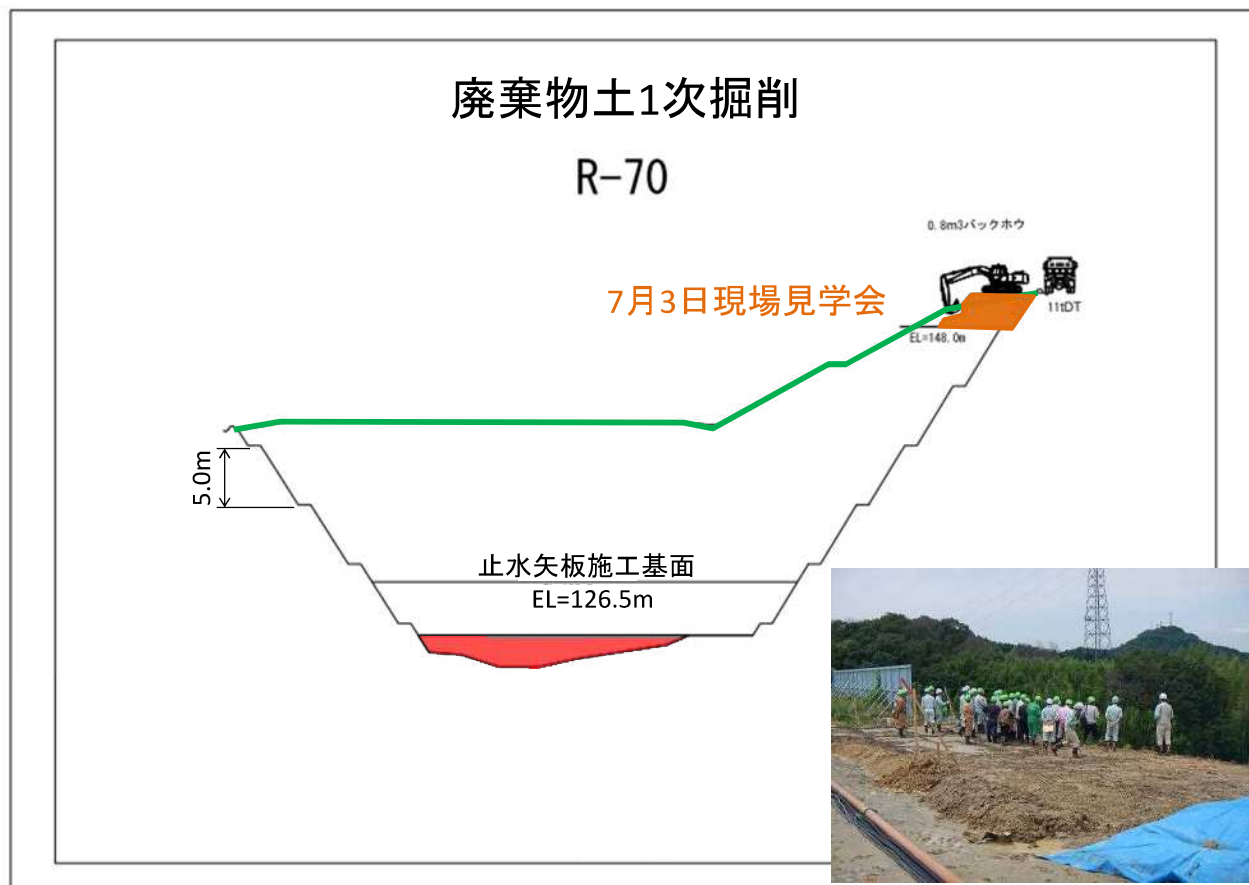


A工区廃棄物土掘削・盛土作業2

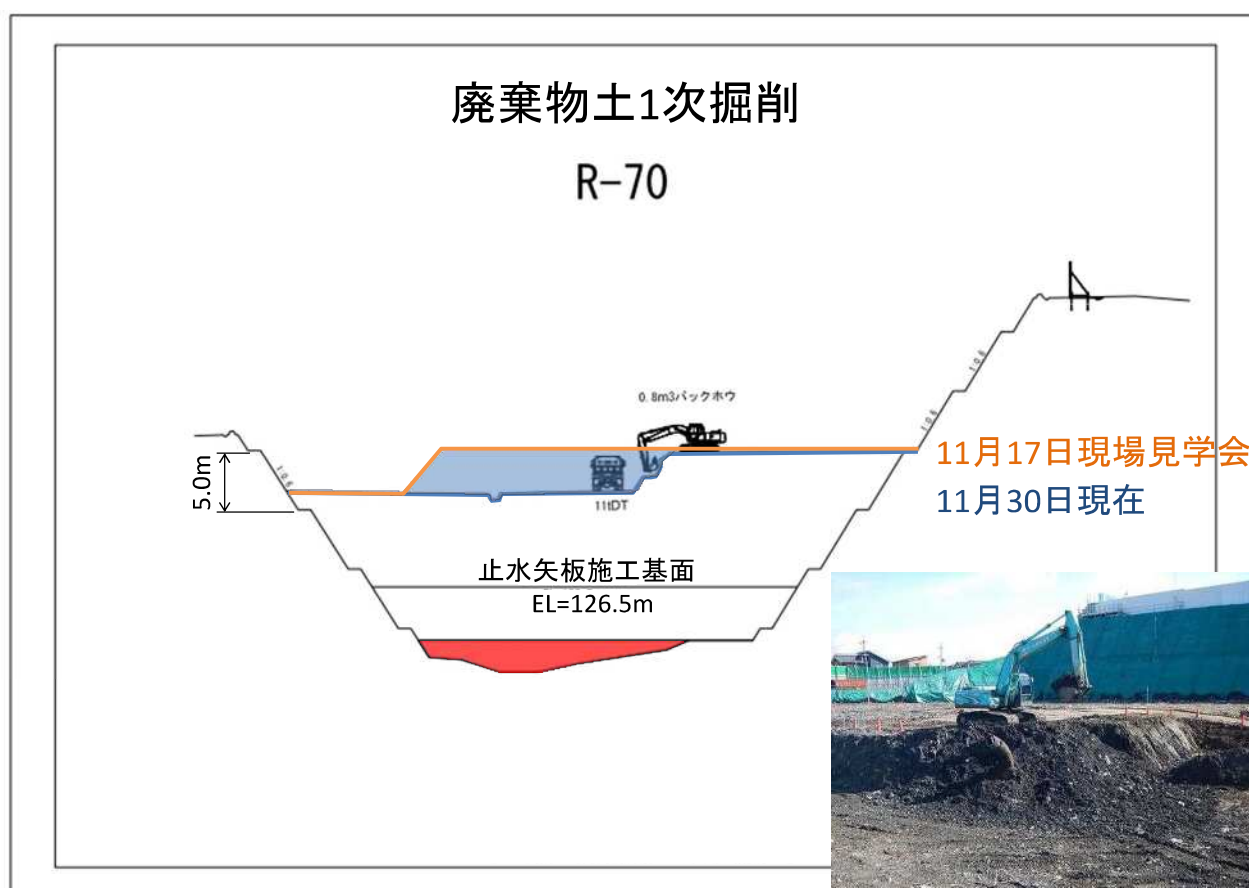

A工区廃棄物土掘削・盛土作業3

平成28年度施工予定①: 止水矢板打設・掘削

R-70

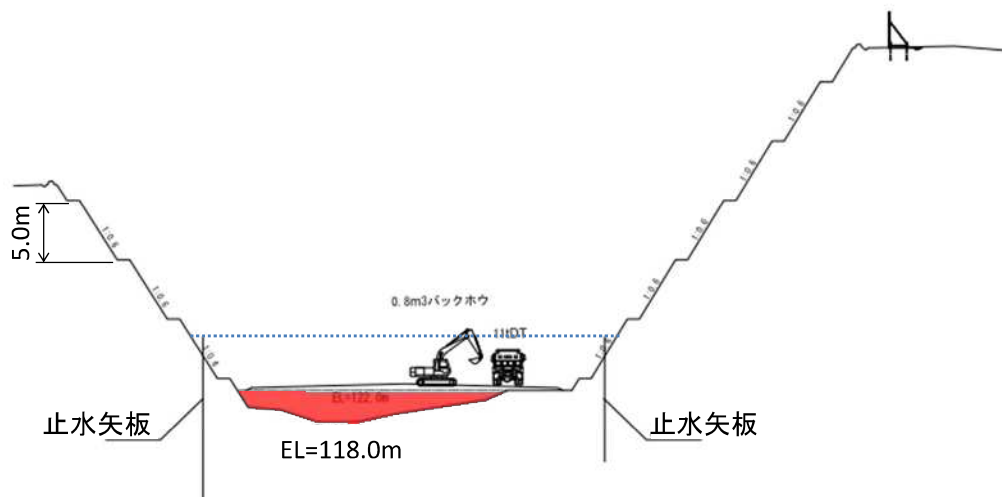


9

A工区廃棄物土掘削・盛土作業4

平成28年度施工予定②: 底面遮水・浸透水貯留層・埋戻

R-70

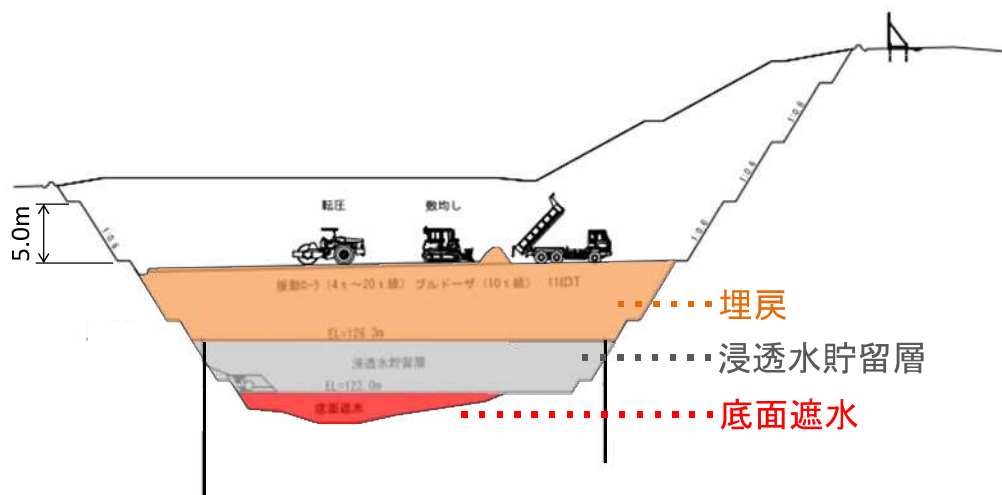

10
