

資料-3  
滋賀県公共事業評価監視委員会  
令和2年2月19日

# 「滋賀県における安全安心な都市公園 づくり【重点】(防災・安全)「その2」」 の中間評価について

滋賀県土木交通部  
都市計画課



# 1. はじめに

## 県営都市公園の概要

### ■ 県営公園数 6公園


- ・奥びわスポーツの森
- ・春日山公園
- ・びわこ地球市民の森
- ・びわこ文化公園
- ・尾花川公園
- ・湖岸緑地

- ・県営金亀公園(仮称)(整備中)

### ■ 管理面積 288.93ha


### ■ すべての公園で指定管理者制度を導入

### ■ 平成30年度利用者数 約323万人

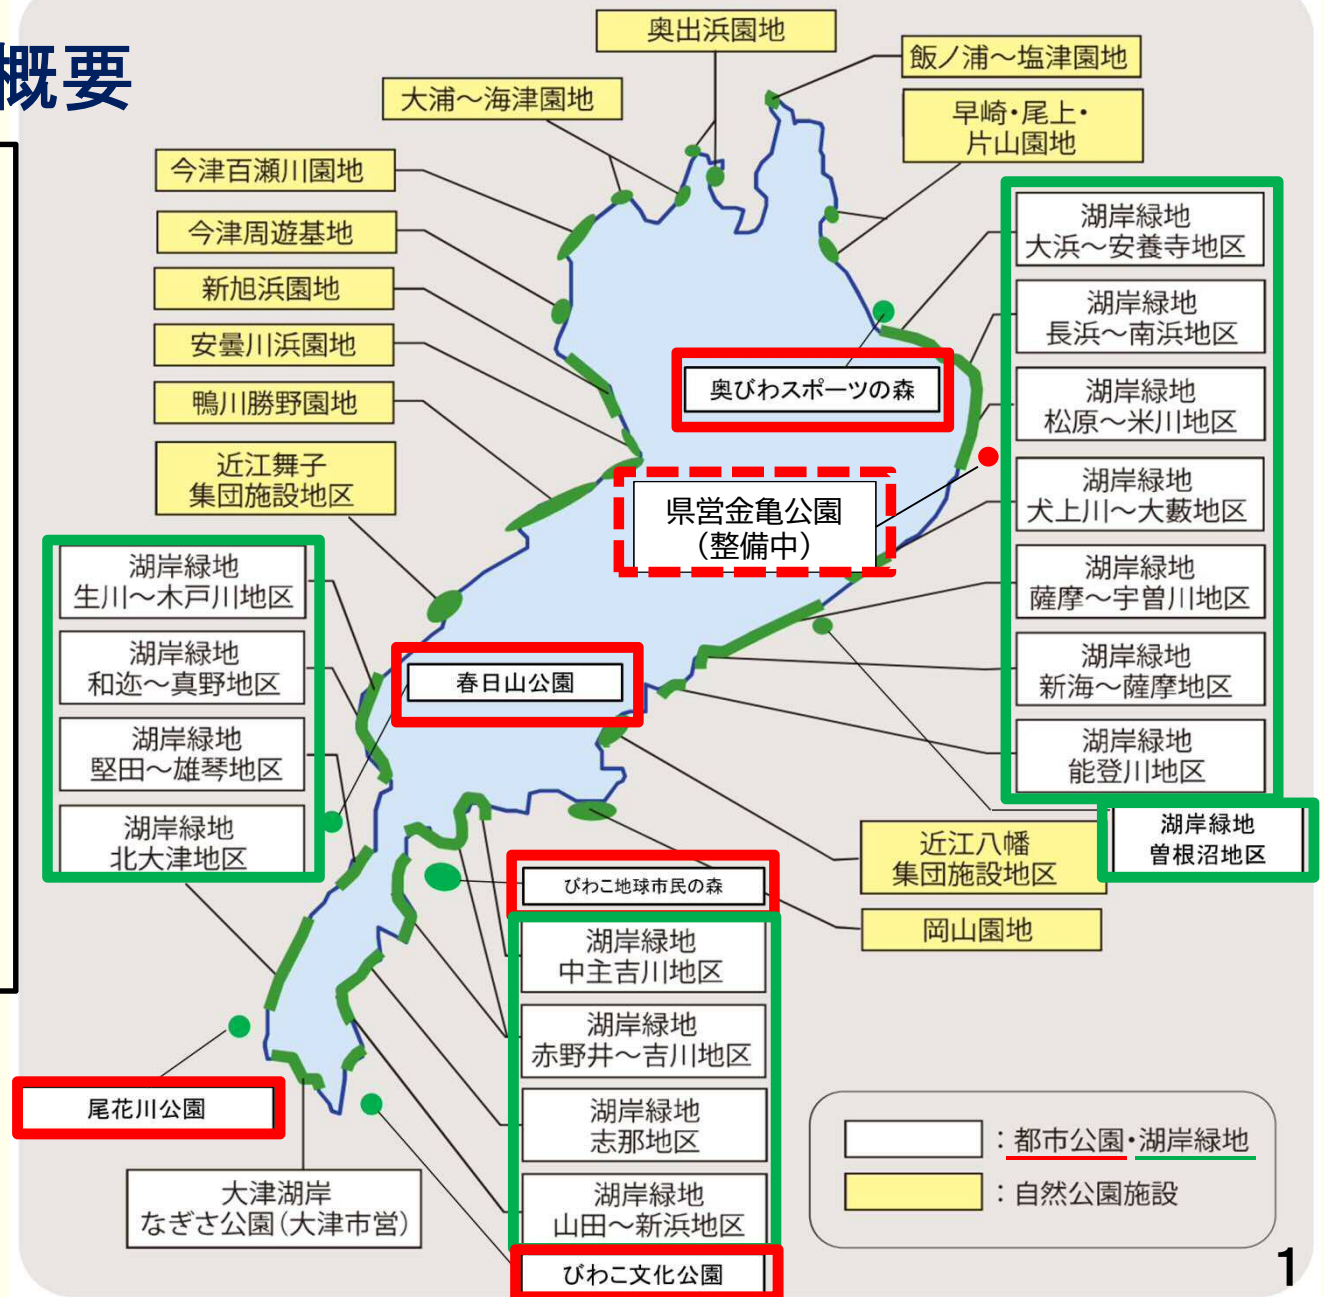

## 2. 交付金制度の変遷

- ◇ 社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設。
- ◇ 防災・安全交付金は、地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策や、事前防災・減災対策の取り組み、地域における総合的な生活空間の安全確保の取り組みを集中的に支援するため、平成24年度補正予算において創設。

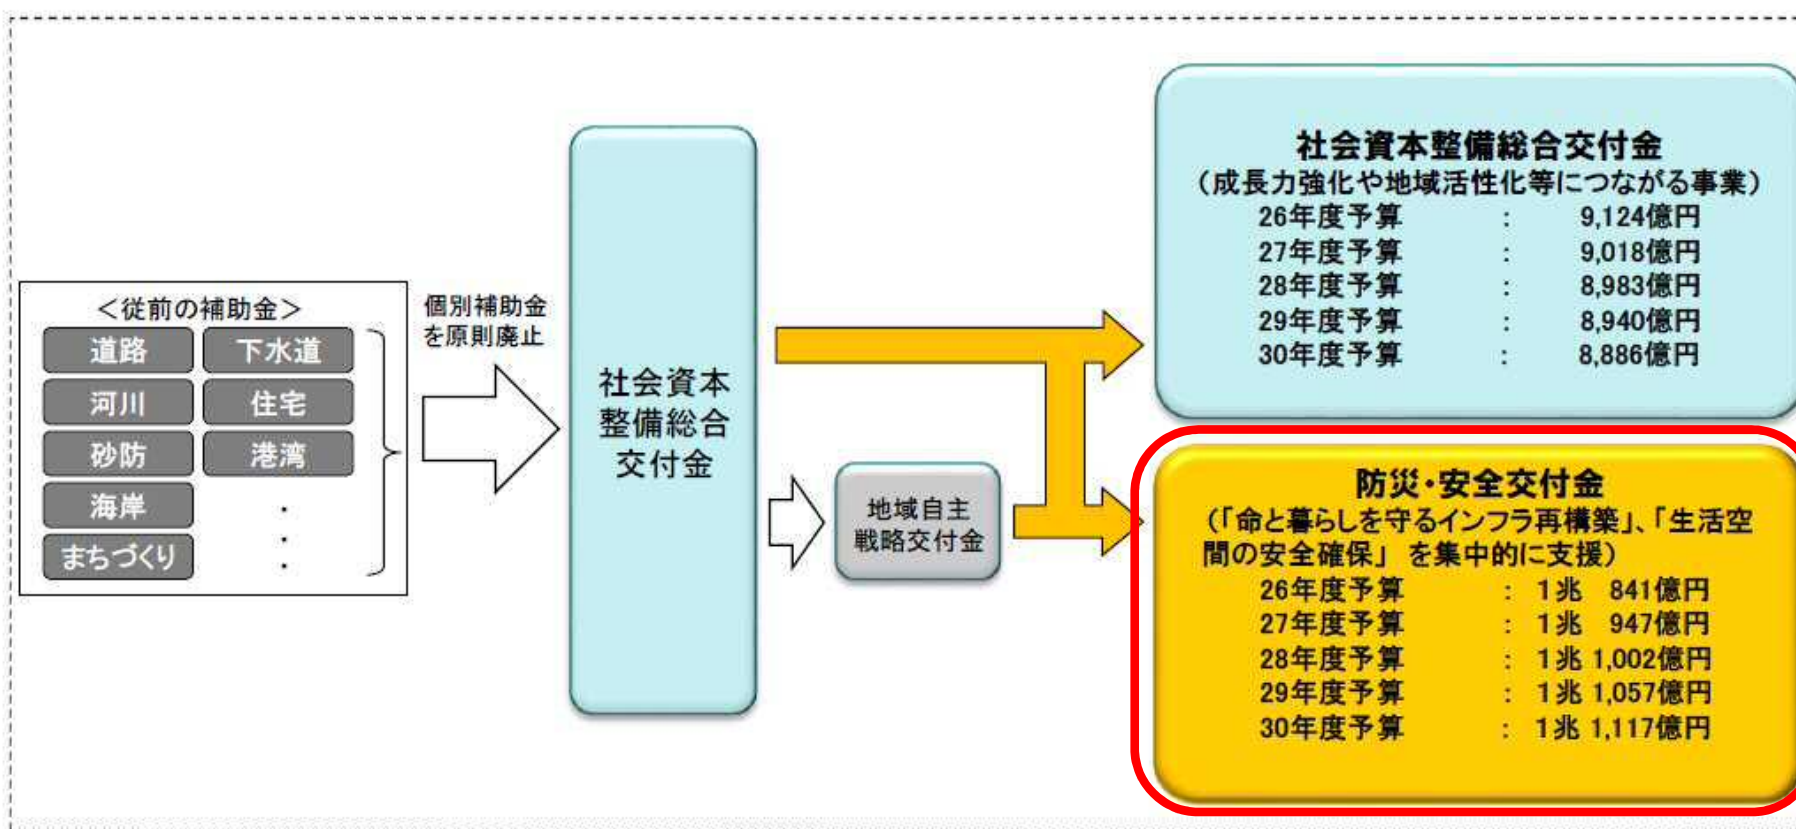



# 2. 交付金制度の変遷



### 3. 滋賀県における安全・安心な都市公園づくり【重点】

#### ◆計画の期間

平成29年度～令和3年度(5年間)

事業名	事業実施期間(年度)							
	計画の期間(年度)					R4	R5	R6
	H29	H30	R1(H31)	R2	R3			
金亀公園整備	—————▶					---	---	▶ 国 スポ
びわこ文化公園整備	—————▶							

#### ◆計画の目標

県民が安全・安心して利用できる公園づくり

##### ①大災害に備え防災公園を整備する

- ・ 広域陸上輸送拠点の整備
- ・ 緊急消防援助機能、避難・備蓄機能の整備

##### ②金亀公園において、賑わいを創出する

- ・ 多様なレクリエーション機能を備え、利用促進を目指す

##### ③びわこ文化公園において、賑わいを創出する

- ・ 美術館と連携し、利用促進を目指す

### 3. 滋賀県における安全・安心な都市公園づくり【重点】

#### 計画の成果目標(定量的指標)

##### ① 都市公園における広域陸上輸送拠点の増加面積

###### 定量的指標の現況値および目標値

	H29年 (当初)	R元年末 (H31年末)	R3年末
目標値	0ha	0.1ha	4.1ha

##### ②、③都市公園における大会やイベント回数の増加率 (当初:38回/年)


###### 定量的指標の現況値および目標値

	H29年 (当初)	R元年末 (H31年末)	R3年末
目標値	100% (38回/年)	—	130%

# 4. 事業対象公園

## 県営都市公園 位置図

- 奥びわスポーツの森
- 春日山公園
- びわこ地球市民の森
- びわこ文化公園**
- 尾花川公園
- 湖岸緑地
- 県営金亀公園**

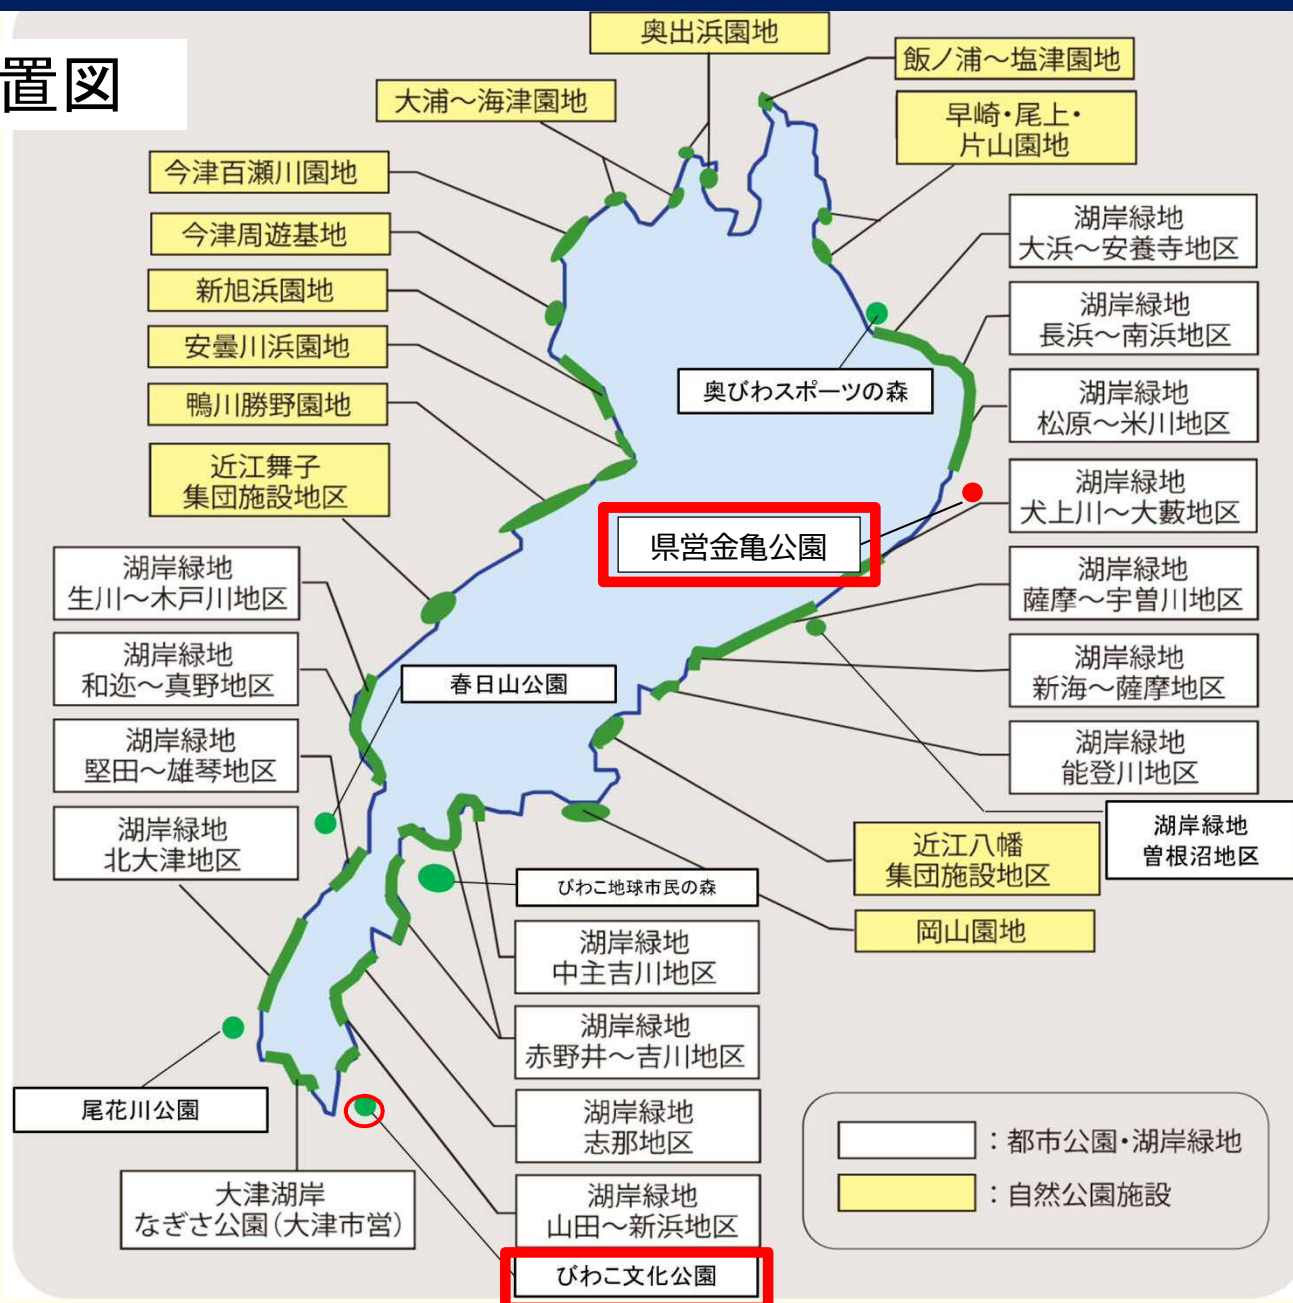

## 5. 防災機能を有する公園

### ◆滋賀県防災計画に位置付けられている県営都市公園

#### ◇広域陸上輸送拠点

- ① びわこ文化公園(文化ゾーン)
- ② 奥びわスポーツの森
- ③ 県営金亀公園(仮称)(彦根総合運動場)


### ◆上記のうち防災機能の強化改修を実施する公園

- ① びわこ文化公園(文化ゾーン)
- ③ 県営金亀公園(仮称)(彦根総合運動場)



# 6. 整備効果の発現状況(びわこ文化公園)

## びわこ文化公園 災害時対応ゾーニング計画

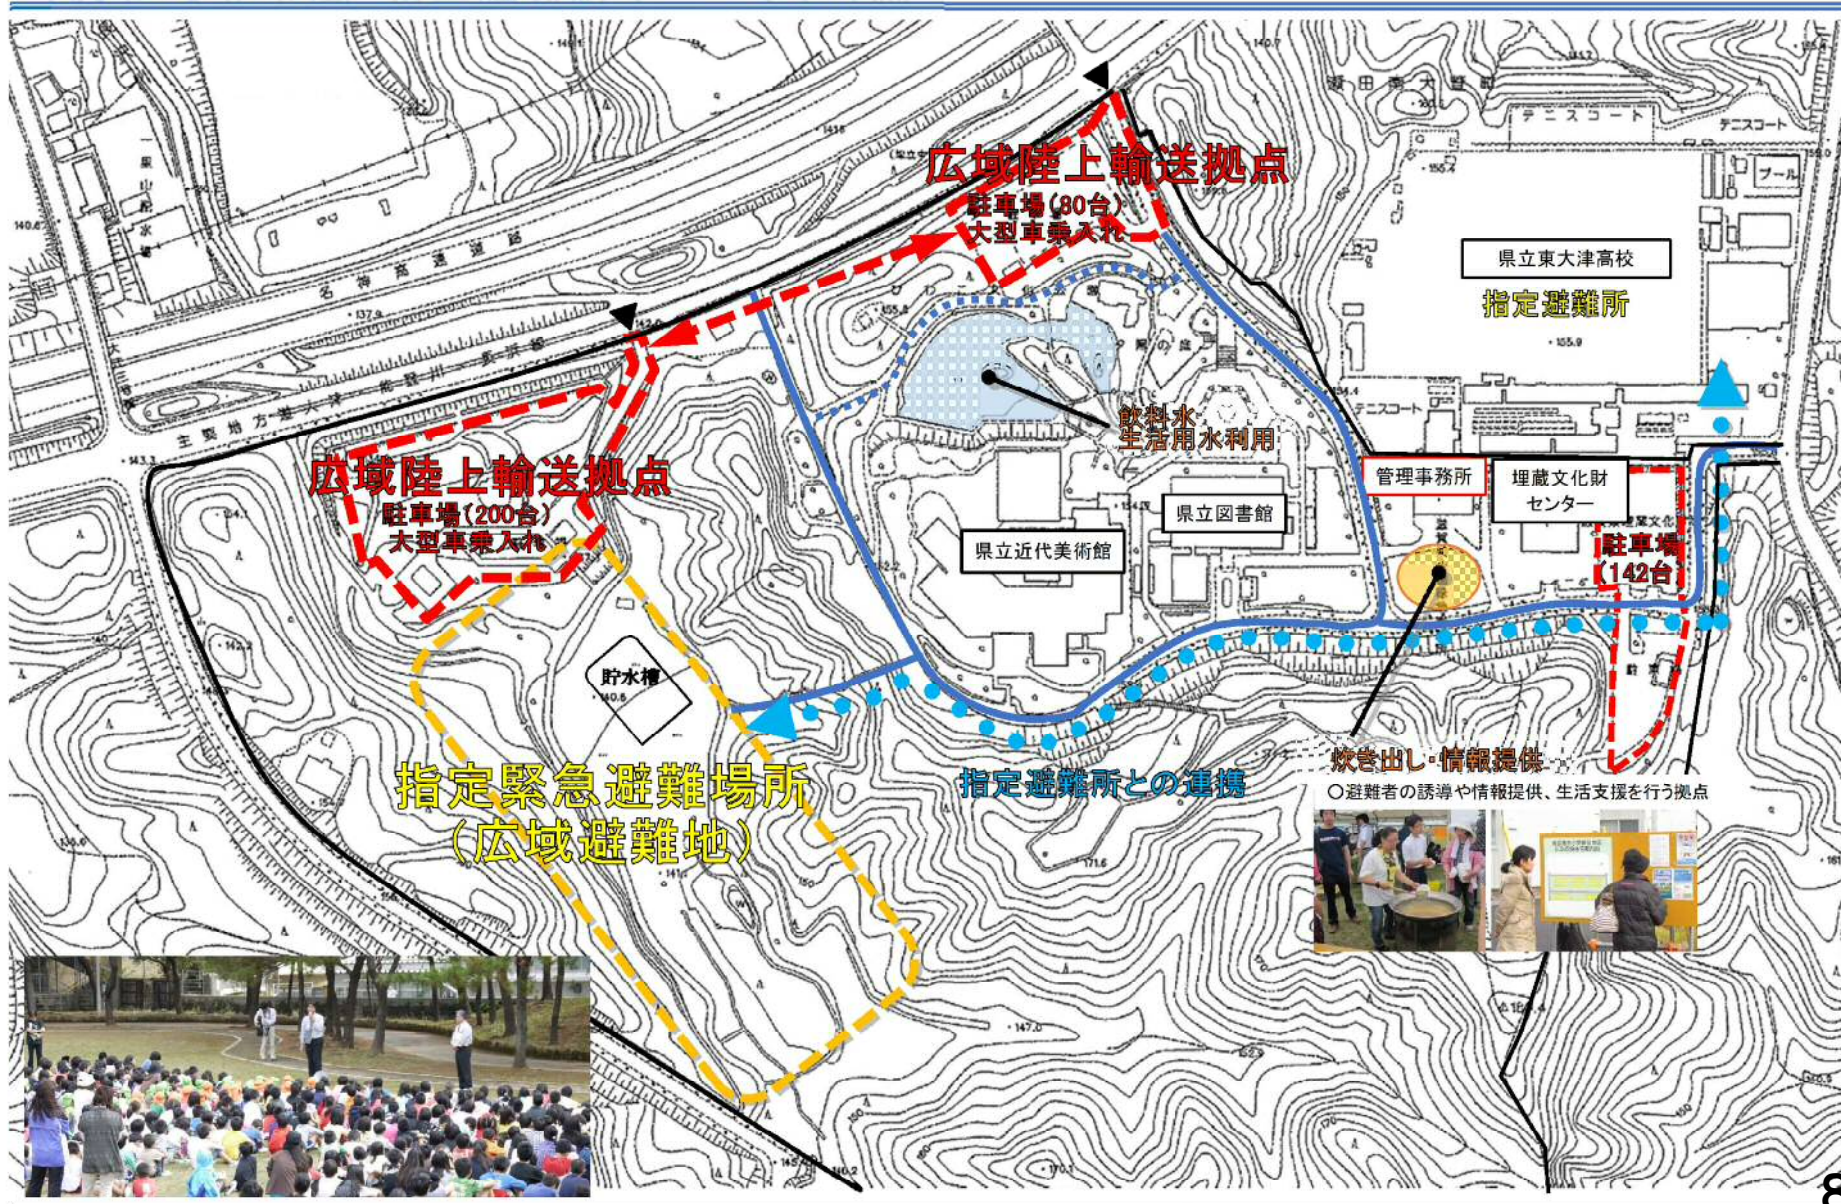

# 6. 整備効果の発現状況(びわこ文化公園)

## 地域防災計画

滋賀県 広域陸上輸送拠点  
 大津市 避難所(地震、洪水、大規模火災)

※大規模火災は、広域避難地に準ずる


## 整備事業費

(単位:百万円)

項目	整備内容	H27	H28	H29	H30	R1 (H31)	計
測量・設計	測量・実施設計 (東・西・北駐車場)		←→				21
	測量・実施設計 (連絡通路、園内園路)			←→			16
工事	東駐車場(駐車場整備)		←→				15
	西駐車場(駐車場整備)			←→			94
	北駐車場(駐車場整備)				←→		91
	北～西駐車場連絡通路 (通路整備)				←→		85
	西駐車場～美術館園路新 設(園路整備)				←→		80
	バリアフリー化(園路整備) サイン関係				←→		67
計							470



# 6. 整備効果の発現状況(びわこ文化公園)

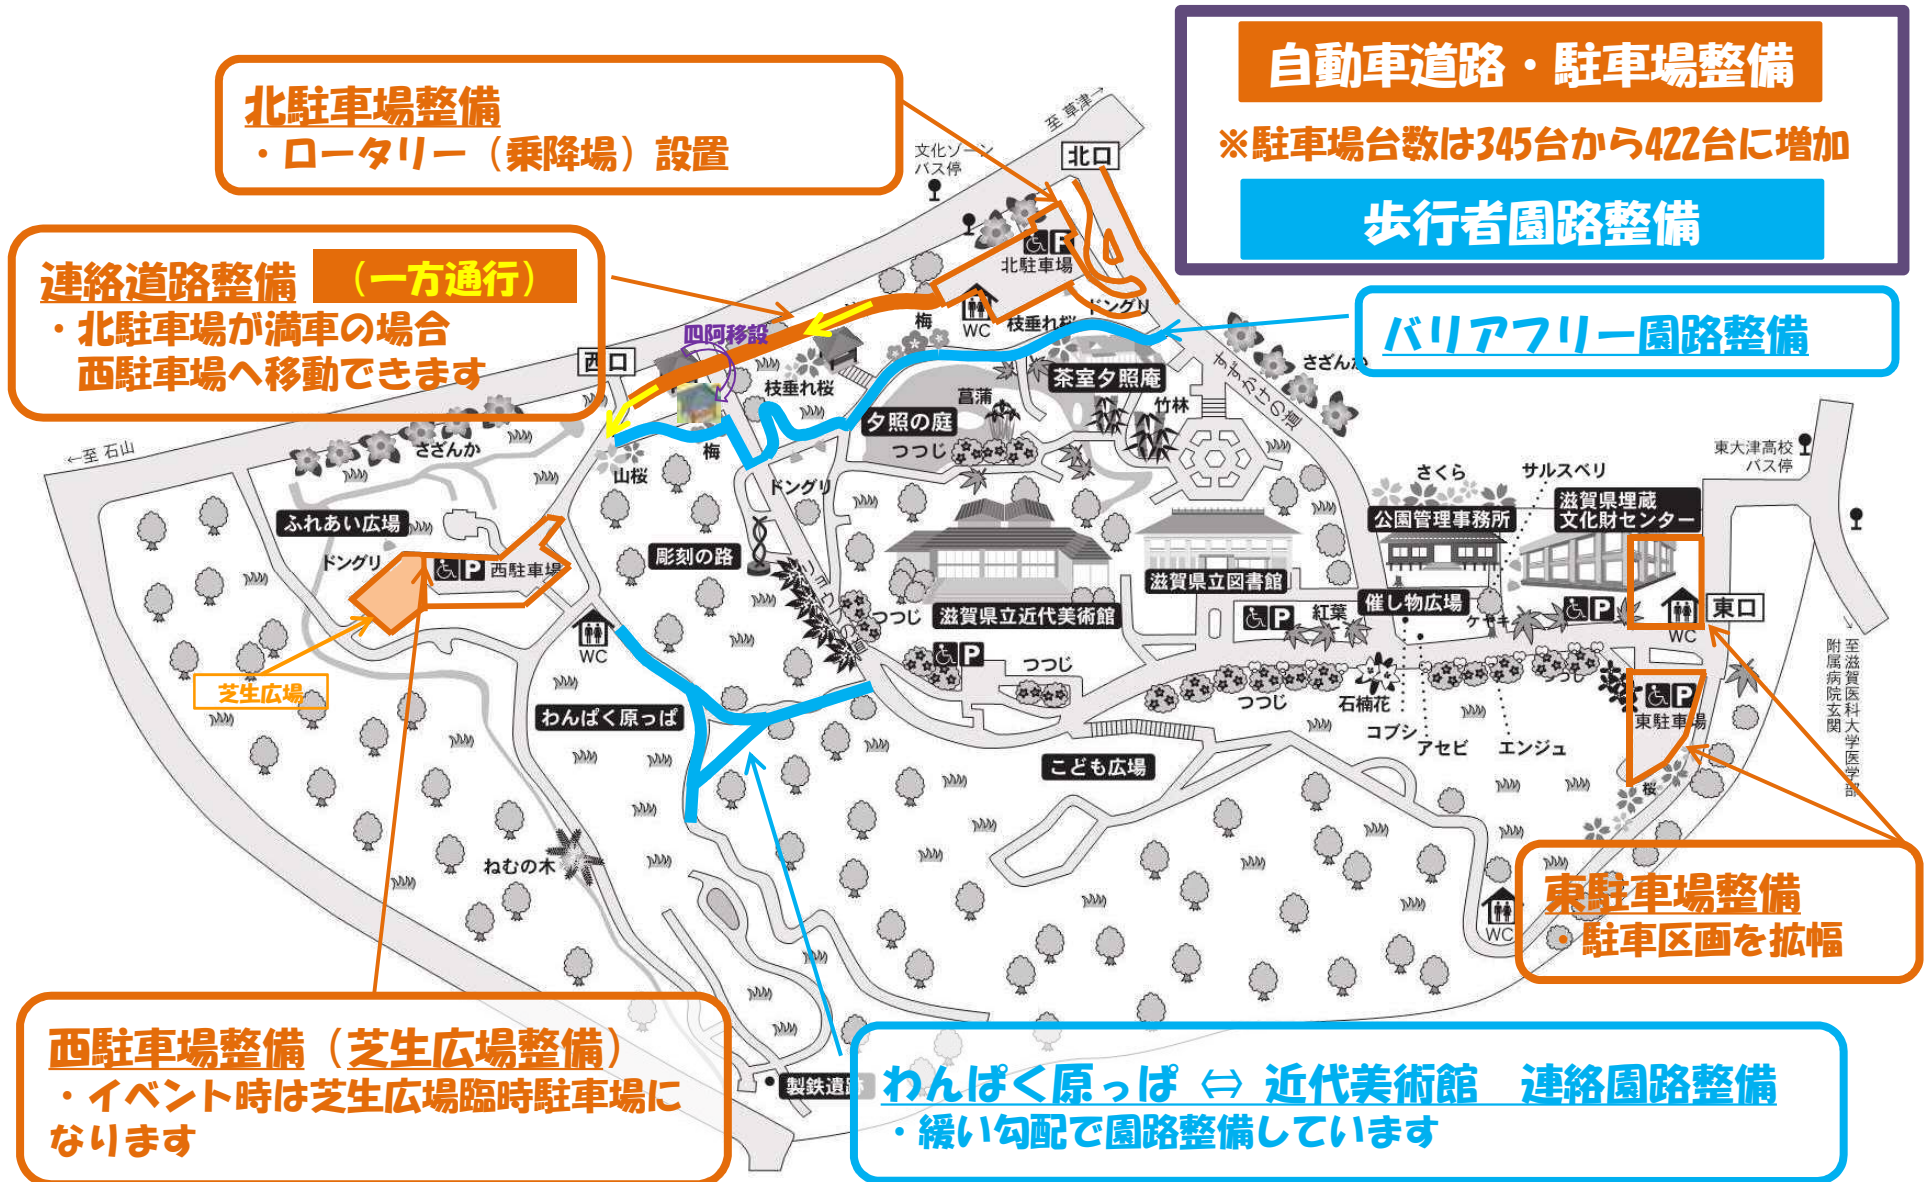



# 6. 整備効果の発現状況(びわこ文化公園)

## 北駐車場



# 6. 整備効果の発現状況(びわこ文化公園)

## 西駐車場



### 整備前



### 整備後





# 6. 整備効果の発現状況(びわこ文化公園)

## 連絡通路



北駐車場側  
整備前



北駐車場側  
整備後



# 6. 整備効果の発現状況(びわこ文化公園)

## 園路整備





# 6. 整備効果の発現状況(びわこ文化公園)

## 園路整備



わんぱく原っぱ～美術館への連絡園路（整備中）





## 7. 整備効果の発現状況(県営金亀公園)

- ・H26～29:基本計画・基本設計・実施設計
- ・H29～:既存施設撤去工事・公園整備工事 (整備計画期間事業費:150億円 )
- ・R6:国民スポーツ大会



県営金亀公園(仮称)および金亀公園(彦根市・彦根城)



# 7. 整備効果の発現状況(県営金亀公園)

計画平面図(案)


S=1:1250(A1)





# 7. 整備効果の発現状況(県営金亀公園)

防災施設の対応検討図

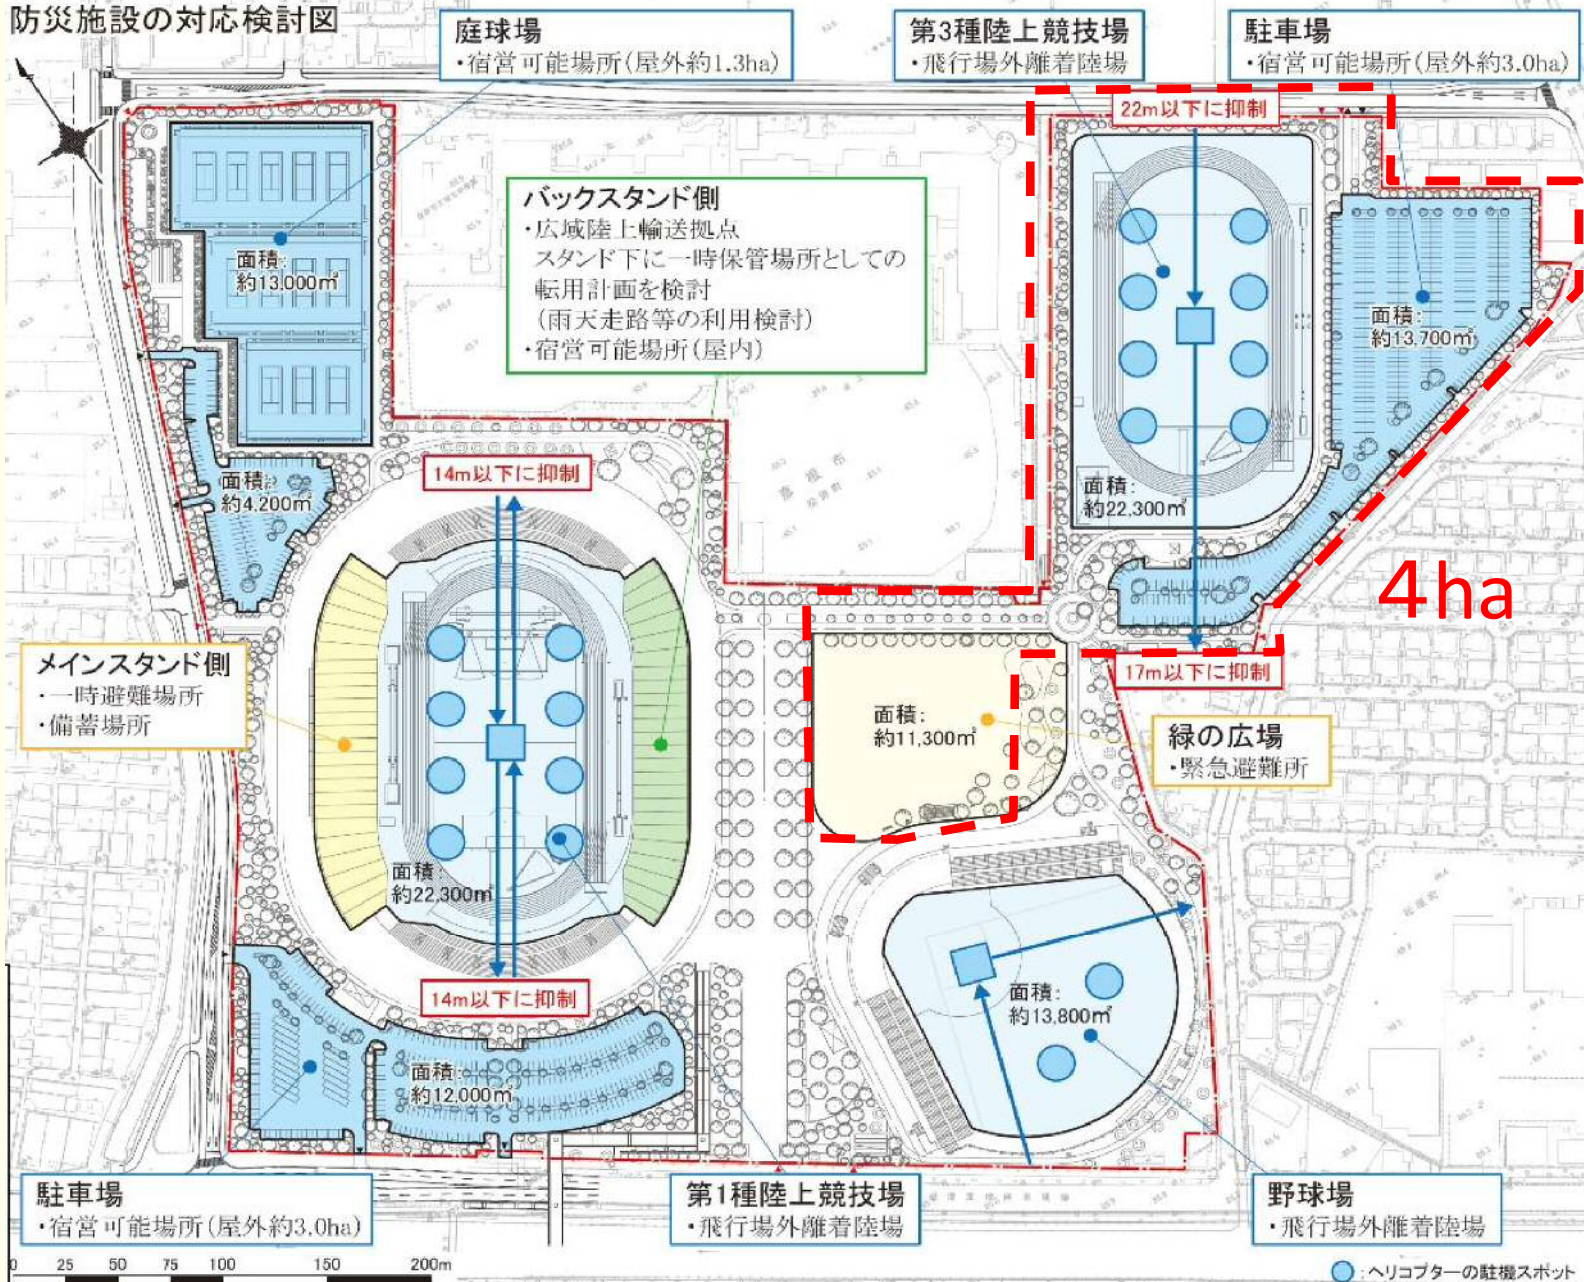



# 7. 整備効果の発現状況(県営金亀公園)



## 整備状況



①既存施設撤去済み



②既存施設撤去済み

# 7. 整備効果の発現状況(県営金亀公園)

## 整備状況



③地盤改良工事



④造成工事



# 8. 定量的指標の達成状況(指標①)

## ① 都市公園における広域陸上輸送拠点の増加面積


### 定量的指標の現況値および目標値

	H29年 (当初)	R元年末 (H31年末)	R3年末
目標値	0ha	0.1ha	4.1ha
実績値	0ha	0.3ha	

### 整備内容

- ※大型車両が転回可能
- ※大型車両の通行に対応した舗装構成

種別	単位	数量	備考
コンクリート舗装	m <sup>2</sup>	241.3	115.5 206.8
インターロック舗装	m <sup>2</sup>	-	18.3 18.3
早乾舗装	m <sup>2</sup>	-	211.8 211.8
植土	m <sup>2</sup>	-	257.3 257.3
植土	m <sup>2</sup>	-	217.8 217.8
植土	m <sup>2</sup>	-	81.4 81.4
植土	m <sup>2</sup>	-	8.6 8.6
植土	m <sup>2</sup>	-	7.3 7.3
植土	m <sup>2</sup>	-	1.5 1.5
植土	m <sup>2</sup>	-	44.3 44.3

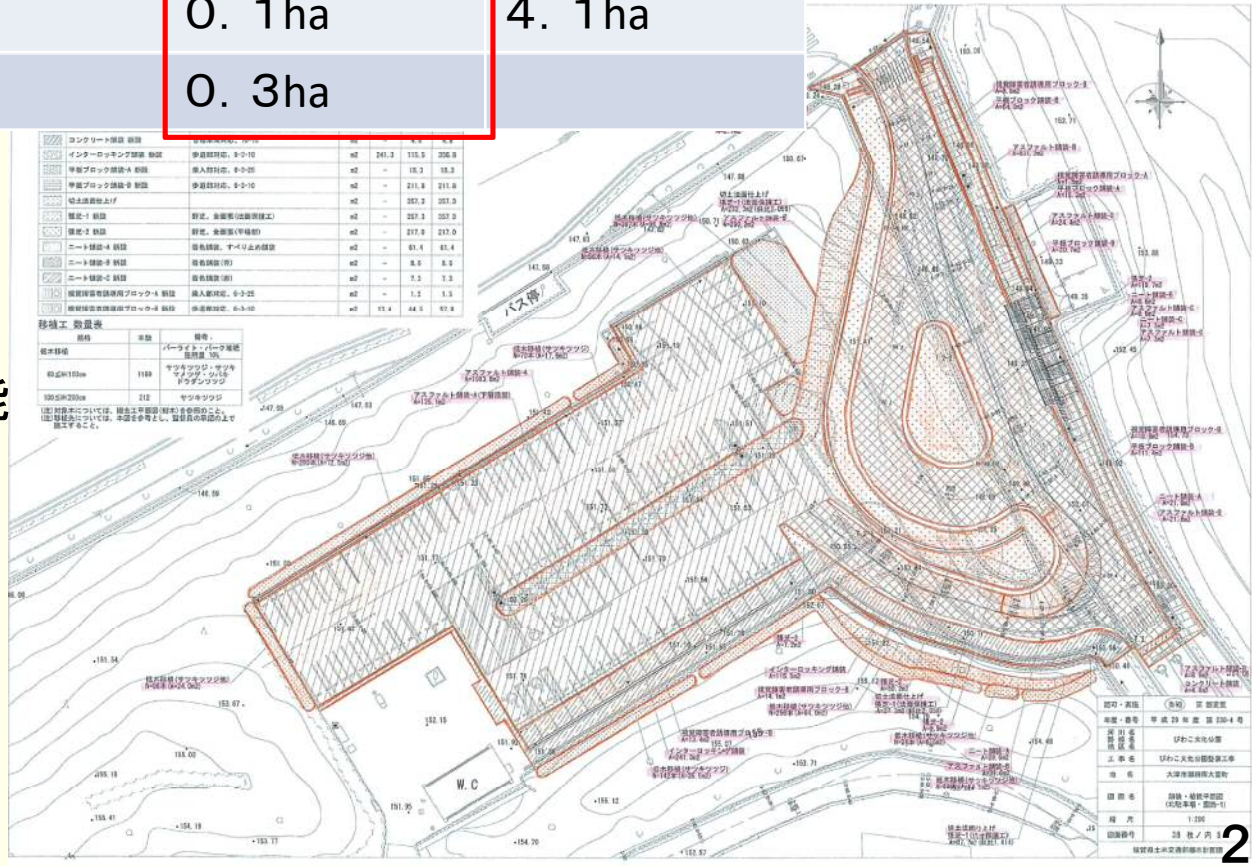

# 8. 定量的指標の達成状況(指標②)

## ②、③都市公園における大会やイベント回数の増加率

定量的指標の現況値および目標値

	H29年 (当初)	R元年末 (H31年末)	R3年末
目標値	100% (38回/年)	—	130%
実績値	100% (38回/年)	105% (40回/年)	





## 9. まとめ

### ◆事業の進捗状況

- びわこ文化公園 : 令和元年度完了
- 県営金亀公園(仮称): 整備工事着手(令和6年度完了)

### ◆評価指標の目標値の実現状況

- 広域陸上輸送拠点の増加面積について  
中間目標値 0.1haに対して、0.3haの実績値で  
目標を達成。
- 大会やイベント回数の増加率について  
中間目標値を設定していないが、当初38回に対して、  
40回の実績値。今後、施設内外との連携し賑わいを  
創出する。
