

平成28年度 緑化事業実績報告書

滋賀鋳産株式会社
伊吹鋳山

平成28年度 緑化実績

緑化区域	計画面積 (㎡)		実績面積 (㎡)		工 法	備 考
	造 成	緑 化	造 成	緑 化		
上部区域	0	5,000	4,200	1,000	吹き付け工法	ソイルシーダーにより吹き付け工法で実施した。 吹き付けを行う種子は、国産在来種のみを使用。 面積減理由は、緑化後強雨により種子が流出した為。
下部区域 オープンシュート北面	0	0	0	0		
計	0	5,000	4,200	1,000		

緑化工法別の年次緑化面積

単位 m²

年度	下部区域緑化面積								上部区域緑化					上部+下部 合計	上部+下部 累計		
	原生植物 移植	植生袋	張	芝	土のう積み	植樹	吹付け 播種	下部区域 合計	下部区域 累計	原生植物 移植	吹付け 播種	張	芝			上部区域 合計	上部区域 累計
46	3,000	250		1,000	150	2,700		7,100	7,100					0	0	7,100	7,100
47	3,600			1,500	3,150	7,350		15,600	22,700					0	0	15,600	22,700
48	4,860			350		3,650		22,460	45,160					0	0	22,460	45,160
49	8,740							13,400	22,140					0	0	22,140	67,300
50	34,500							34,500	101,800					0	0	34,500	101,800
51	27,000							27,000	128,800					0	0	27,000	128,800
52	15,000							15,000	143,800					0	0	15,000	143,800
53	15,500							15,200	30,700					0	0	30,700	174,500
54	8,900							4,000	12,900	4,810				4,810	4,810	17,710	192,210
55	12,290							600	12,890	1,790				1,790	6,600	14,680	206,890
56	11,910								11,910	3,140				3,140	9,740	15,050	221,940
57	8,120								8,120	3,880				3,880	13,620	12,000	233,940
58	11,000								11,000	1,630				1,630	15,250	12,630	246,570
59	14,160								14,160	4,170				4,170	19,420	18,330	264,900
60	15,410								15,410	1,000				1,000	20,420	16,410	281,310
61	10,000								10,000	13,680				13,680	34,100	23,680	304,990
62	5,000								5,000	1,000				1,000	35,100	6,000	310,990
63	4,760			11,300					7,070	23,130				3,090	38,190	26,220	337,210
H/1				10,650					1,580	12,230				870	39,060	13,100	350,310
2				5,080					280	5,360				1,870	40,930	7,230	357,540
3	70			5,020	560				4,500	10,150				3,450	44,380	13,600	371,140
4									9,520	9,520				10,480	54,860	20,000	391,140
5									6,650	6,650				20,150	75,010	26,800	417,940
6									7,000	7,000				8,880	83,890	15,880	433,820
7									5,500	5,500				1,000	84,890	6,500	440,320
8									4,500	4,500				0	84,890	4,500	444,820
9									6,500	6,500				6,300	91,190	12,800	457,620
10				4,520					4,520	370,950				4,000	95,190	8,520	466,140
11				5,500					5,500	376,450				5,400	100,590	10,900	477,040
12				4,100					4,100	380,550				7,900	108,490	12,000	489,040
13				450					450	381,000				3,700	112,190	4,150	493,190
14				1,400					1,400	382,400				2,850	115,040	4,250	497,440
15				370					370	382,770				0	115,040	370	497,810
16				850					850	383,620				0	115,040	850	498,660
17				975					625	1,600				0	115,040	1,600	500,260
18									1,000	1,000				0	116,540	2,500	502,760
19									0	386,220				9,000	125,540	9,000	511,760
20				835					600	1,435				795	126,335	2,230	513,990
21									0	387,655				0	126,335	0	513,990
22				849					849	388,504				0	126,335	849	514,839
23									0	388,504				387	126,722	387	515,226
24									0	388,504				93	126,815	93	515,319
25									0	388,504				0	126,815	0	515,319
26									0	388,504				200	127,015	200	515,519
27									0	388,504				660	127,675	660	516,179
28									0	388,504				1,000	128,675	1,000	517,179



上部区域緑化地

2017.5. 24撮影



下部区域緑化地


2017.5. 24撮影

オープンシュート緑化地

2017.5.24撮影



伊吹鉦山緑化区域

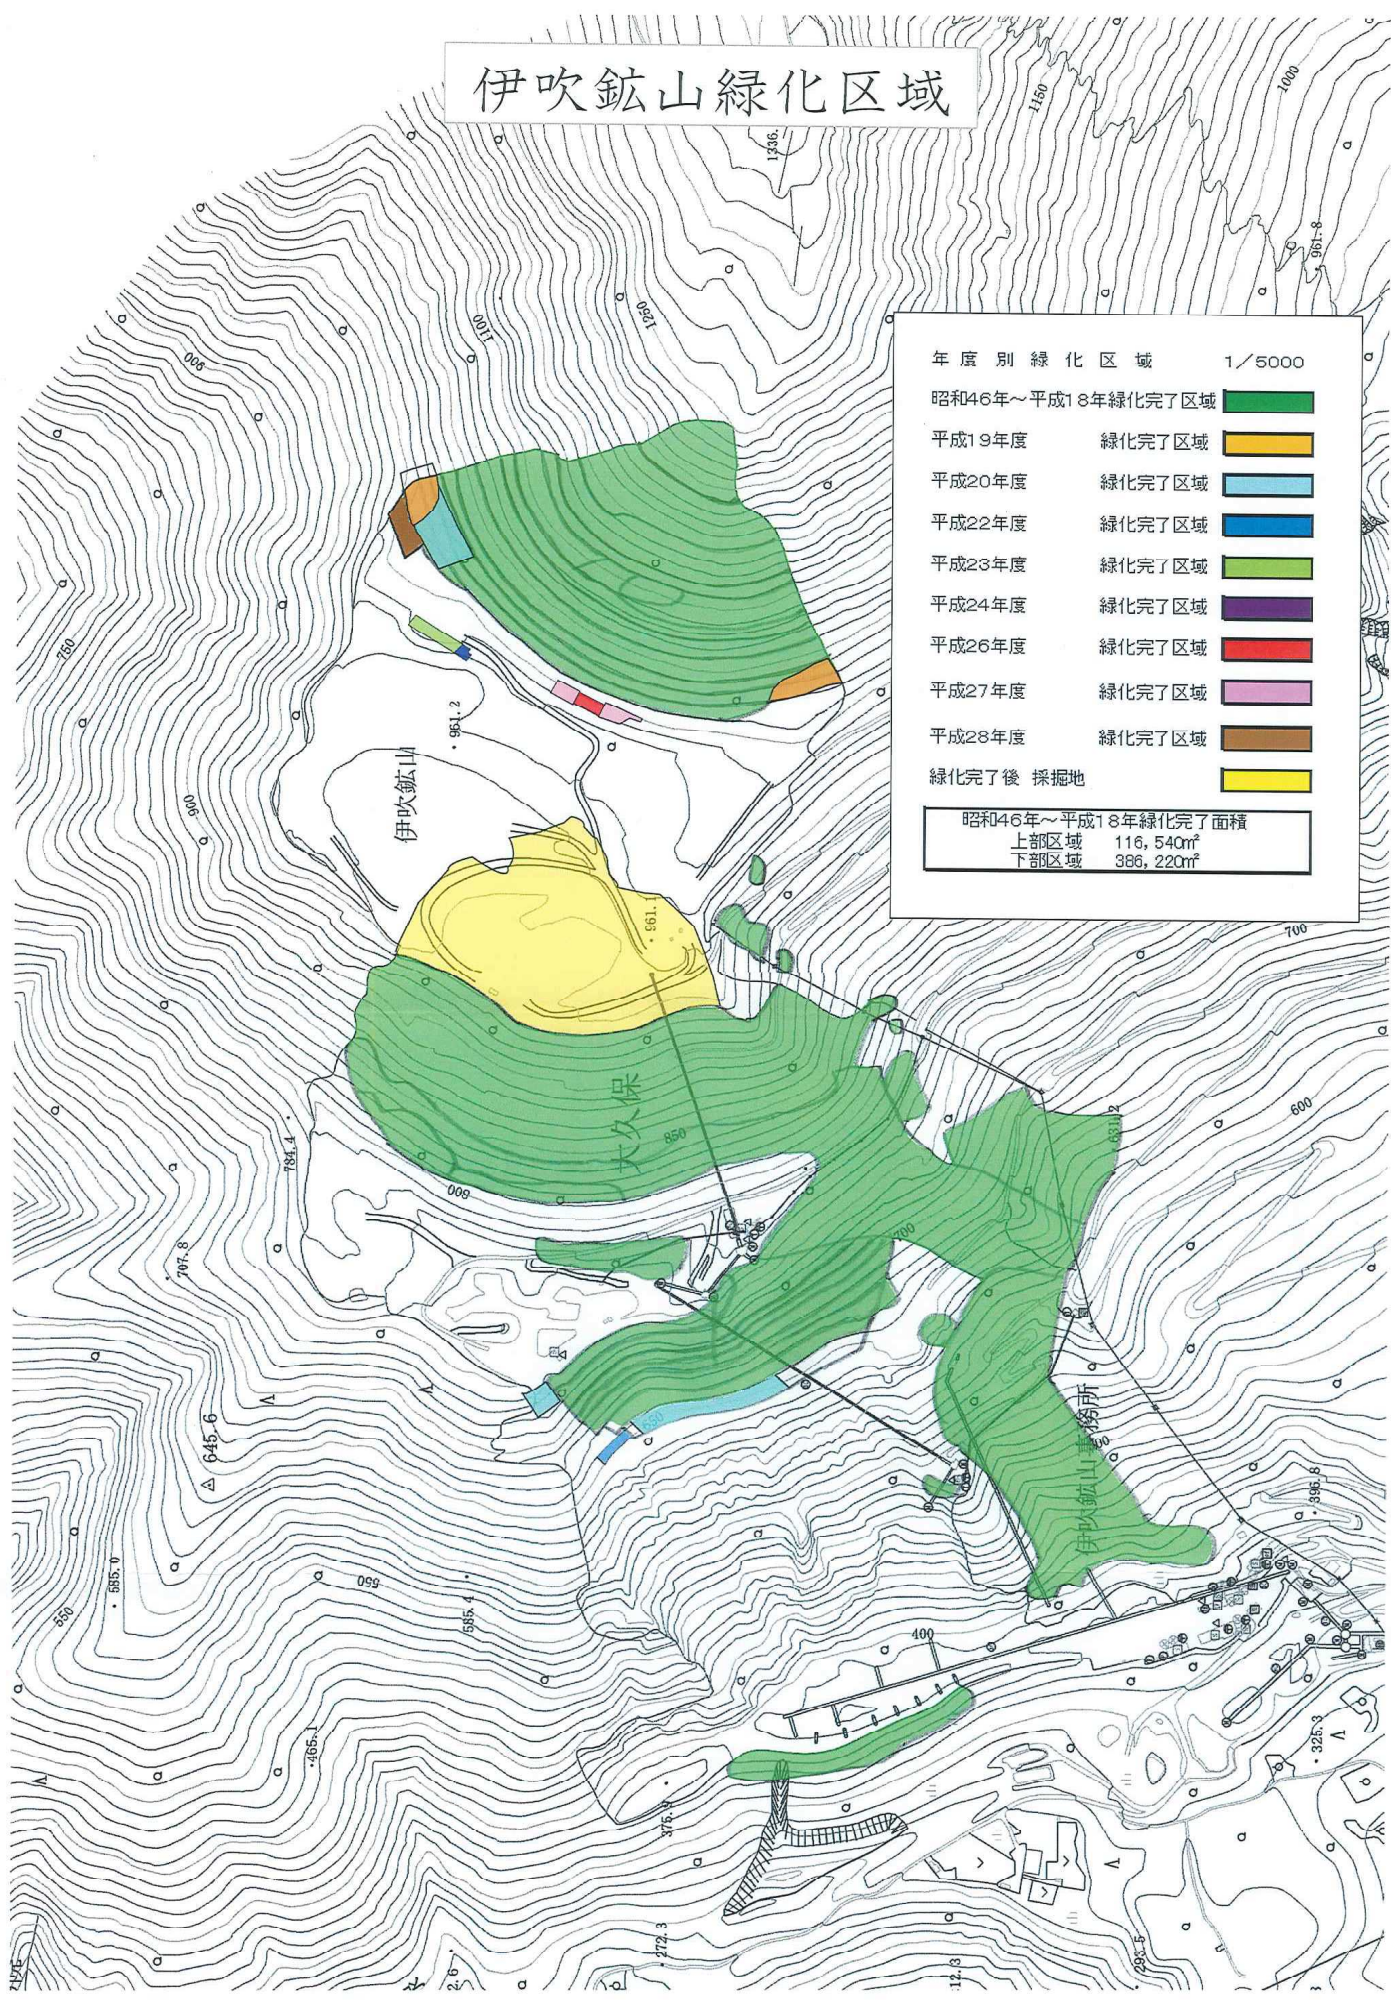

年度別緑化区域 1/5000

- 昭和46年～平成18年緑化完了区域
- 平成19年度 緑化完了区域
- 平成20年度 緑化完了区域
- 平成22年度 緑化完了区域
- 平成23年度 緑化完了区域
- 平成24年度 緑化完了区域
- 平成26年度 緑化完了区域
- 平成27年度 緑化完了区域
- 平成28年度 緑化完了区域
- 緑化完了後 採掘地

昭和46年～平成18年緑化完了面積
 上部区域 116,540㎡
 下部区域 386,220㎡

平成29年度 緑化事業実施計画書


滋賀鋳産株式会社
伊吹鋳山

平成29年度 緑化計画

緑化区域	計画面積 (㎡)		完了時期	工 法	備 考
	造 成	緑 化			
上部区域	0	10,000	11月下旬	吹付け工法	ソイルシーダーにより吹付け工法で実施する。 吹き付けを行う種子は、国産在来種のみを使用する。
下部区域 オープンシュート南面	0	0			
計	0	10,000			

平成29年度 緑化工法

緑化区域により、以下のような工法を主体として緑化を実施する。

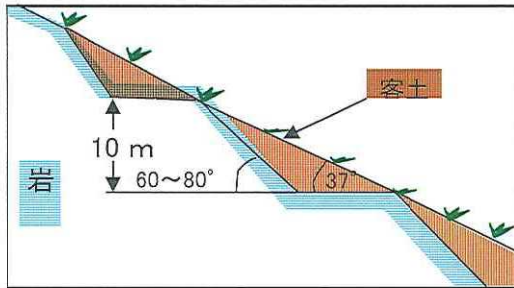

上部区域（原生植物移植、吹き付け工法）
採掘跡地の法面をブルドーザーで約37°（法面傾斜角）に造成し、
ショベルで法面に客土した後、土羽打ちし、吹き付け工法で行う。
