


# 路肩拡幅による自転車通行空間整備状況

(令和6年8月末現在)

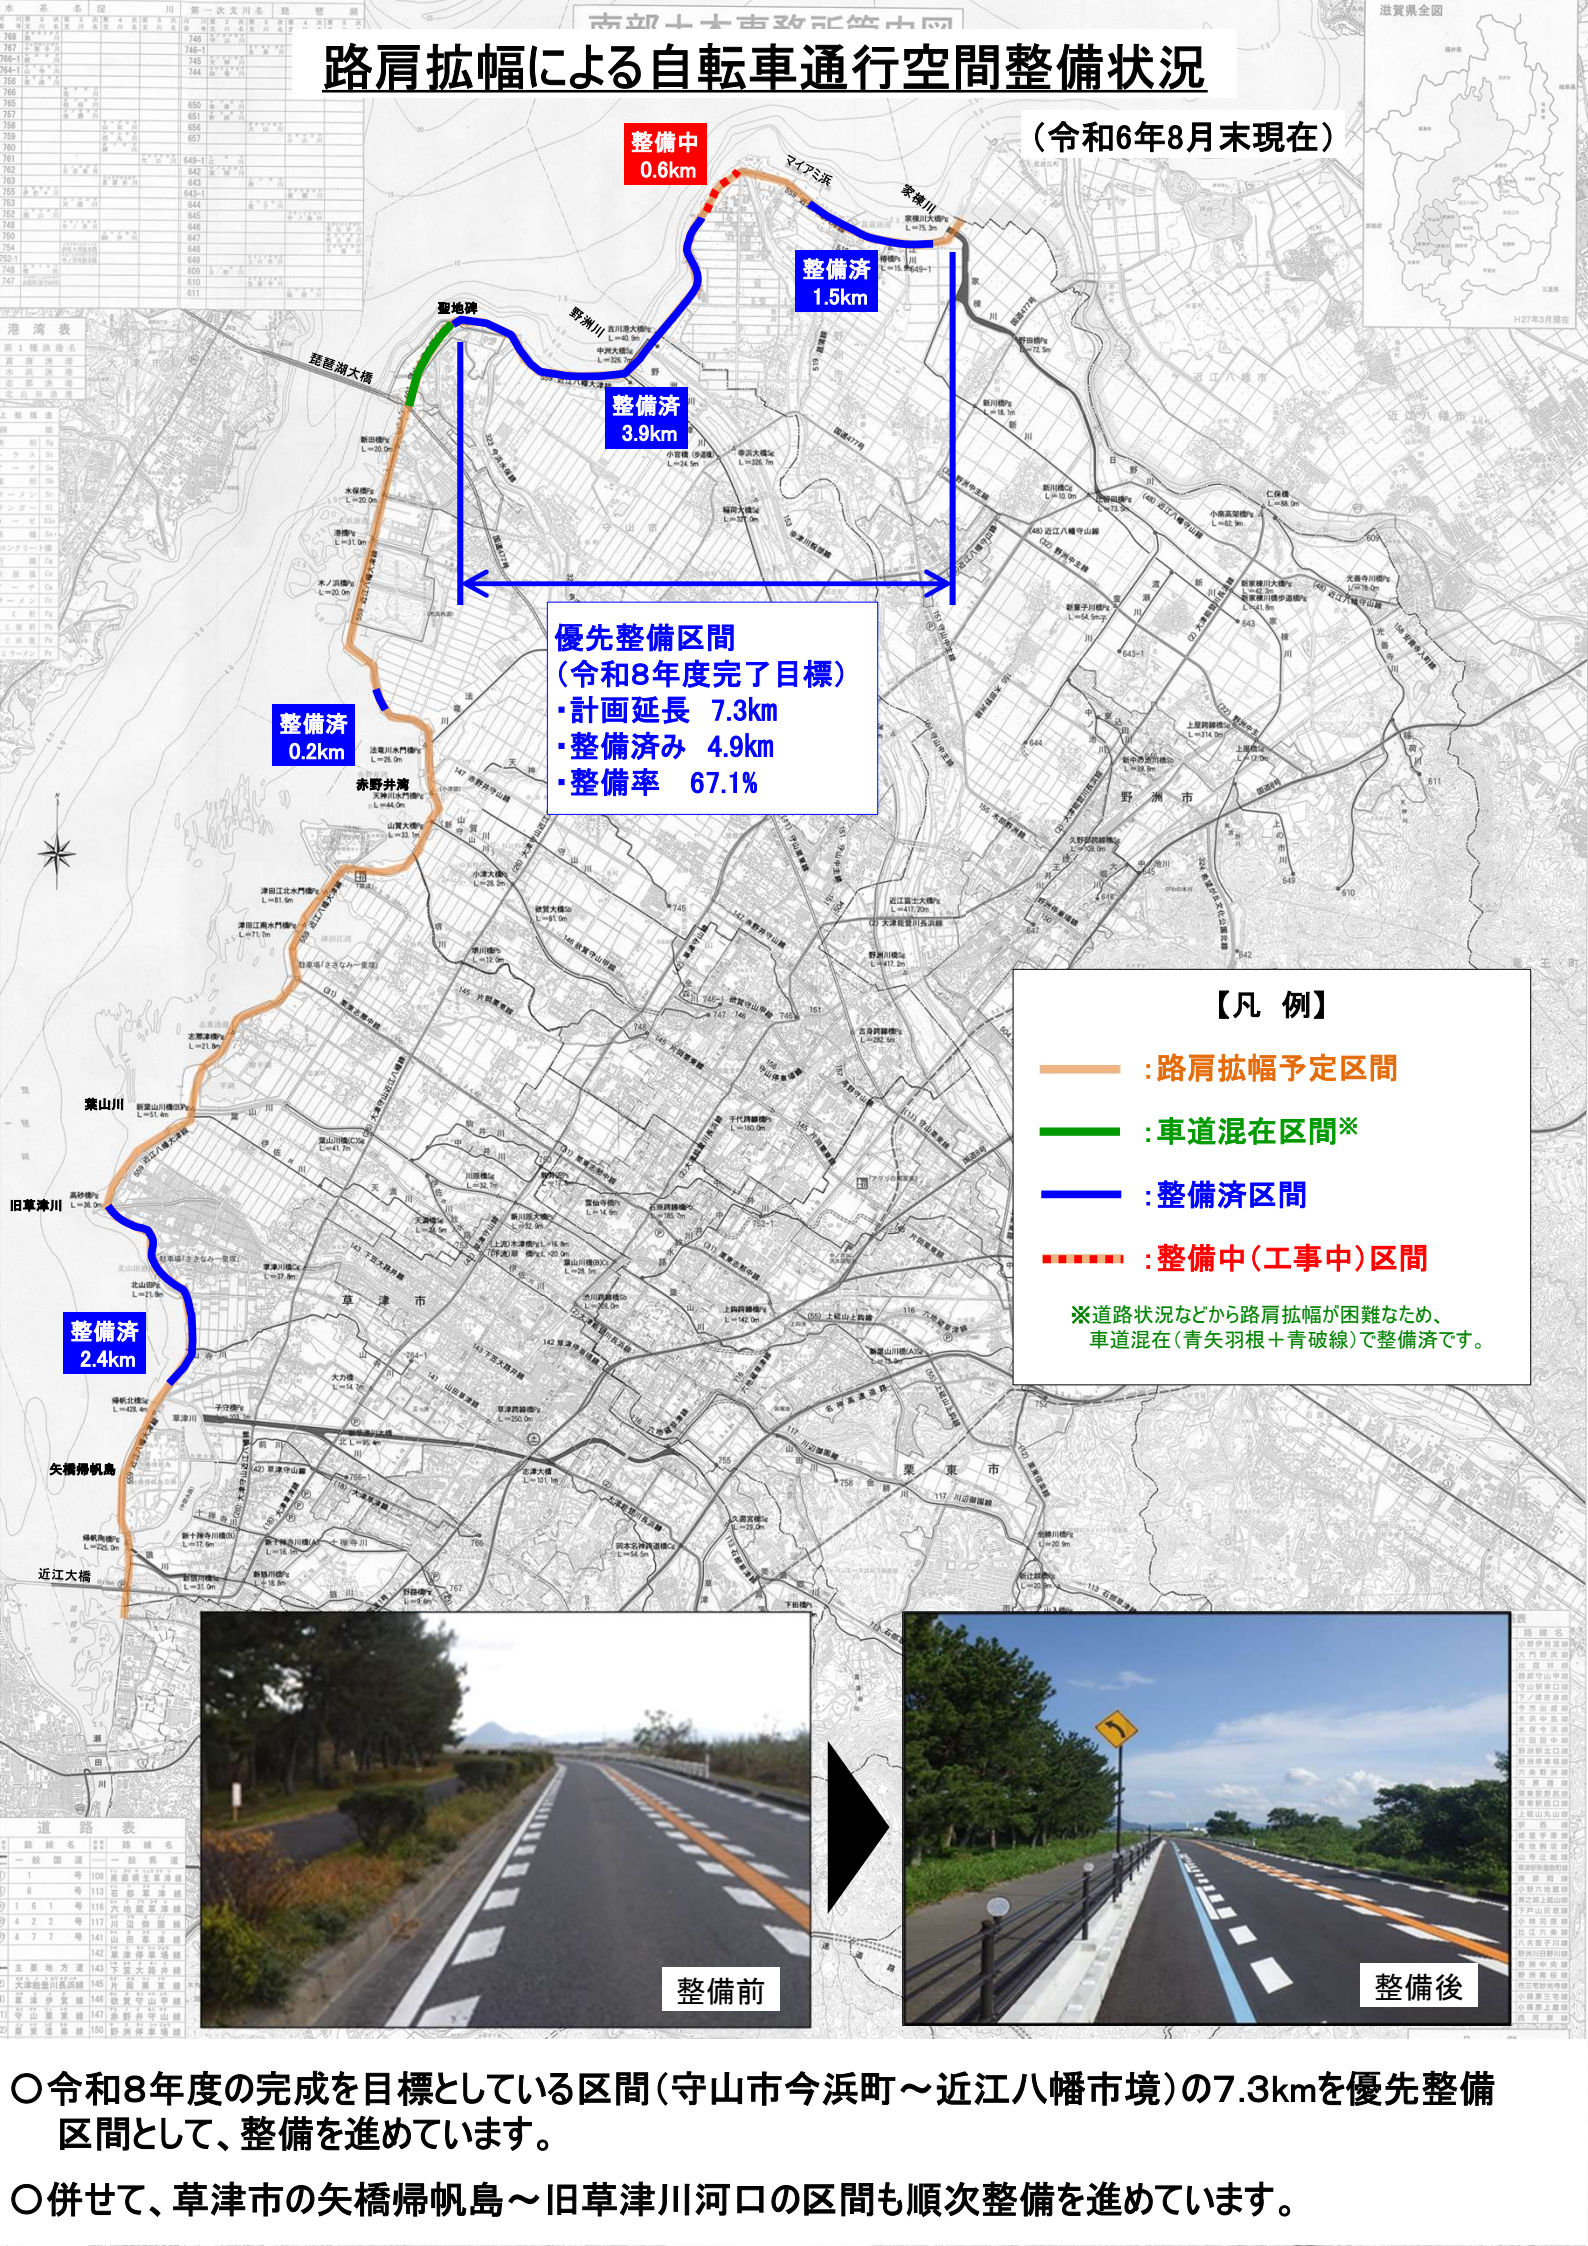

**優先整備区間**  
(令和8年度完了目標)  
 ・計画延長 7.3km  
 ・整備済み 4.9km  
 ・整備率 67.1%

**【凡例】**

- : 路肩拡幅予定区間
- : 車道混在区間※
- : 整備済区間
- : 整備中(工事中)区間

※道路状況などから路肩拡幅が困難なため、車道混在(青矢羽根+青破線)で整備済です。



○令和8年度の完成を目標としている区間(守山市今浜町～近江八幡市境)の7.3kmを優先整備区間として、整備を進めています。

○併せて、草津市の矢橋帰帆島～旧草津川河口の区間も順次整備を進めています。

路線名	距離	整備済	整備中	計画延長
1	108	108	0	108
2	113	113	0	113
3	116	116	0	116
4	117	117	0	117
5	141	141	0	141
6	142	142	0	142
7	143	143	0	143
8	145	145	0	145
9	146	146	0	146
10	147	147	0	147
11	148	148	0	148
12	149	149	0	149
13	150	150	0	150
