


※A工区No.1、No.2を調査

地点名		粘土層の有無	粘土層上面標高 (m)	地表からの粘土層上面深さ (m)	粘土層厚さ (m)
A工区	No.1	有	122.380	17.550	0.95以上
	No.2	有	125.330	12.900	1.20以上
	No.3	有	120.978	19.450	0.55以上
	No.4	未調査	未調査	未調査	未調査
B工区	No.5	有	125.930	8.750	1.25以上
	No.6	有	124.840	9.600	2.60以上
	No.7	有	121.040	10.600	0.70
	No.8	有	125.110	7.400	5.40
D・E工区	No.9	有	127.780	22.600	0.60
	No.10	無	廃棄物下端 126.710	24.150	—
	No.10-1	無	廃棄物下端 126.940	24.000	—
	No.10-2	無	廃棄物下端 126.700	23.900	—
	No.10-3	無	廃棄物下端 127.920	23.200	—
	No.10-4	有	130.450	20.800	0.50
	No.10-5	有	129.810	20.900	1.00
	No.10-6	無	廃棄物下端 127.730	23.200	—
	No.10-7	有	129.770	20.900	1.40
	No.10-8	無	廃棄物下端 127.320	23.750	—
	No.11	有	134.250	16.600	1.15
	No.12	未調査	未調査	未調査	未調査

No.12位置については、計画中

図-1 事前調査ボーリング全体図

凡例
 △ : 未調査
 ● : 粘土有
 ⊗ : 粘土無

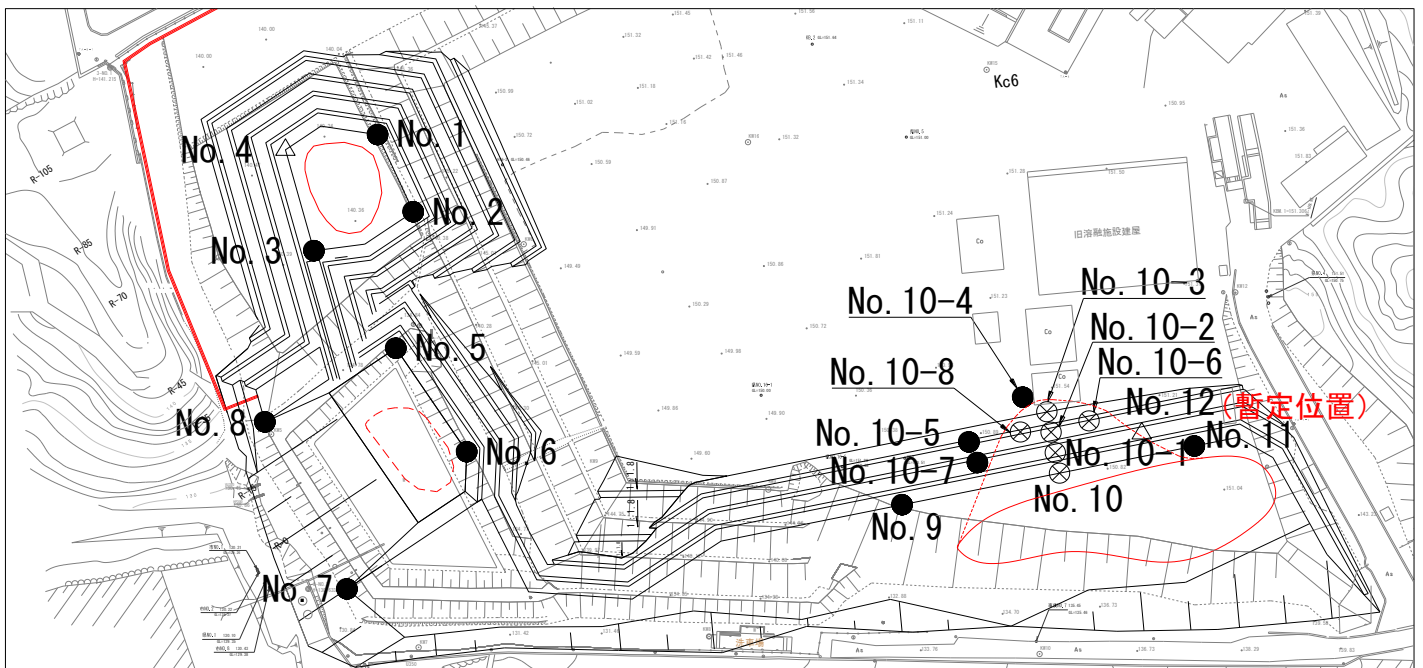

平成27年1月15日時点

