

《旧RD最終処分場 一次対策工事 工事情報 をお知らせいたします。》

平成25年1月25日作成

週間工程		施工実績(先週)							施工予定(今週)							施工予定(来週)							備考					
日付 工種・作業内容		平成25年1月														2月												
		月21	火22	水23	木24	金25	土26	日27	月28	火29	水30	木31	金1	土2	日3	月4	火5	水6	木7	金8	土9	日10						
廃棄物土掘削工	A区画			EM探査					ホーリング調査																			掘削完了
	B区画	掘削		掘削				休			EM探査				掘削現場見学会	休	ホーリング調査										休	1月下旬 掘削完了予定
	C区画										埋戻し(予定)																	2月中旬 埋戻し完了予定
	D区画							工			埋戻し(予定)																工	2月中旬 埋戻し完了予定
旧焼却炉跡コンクリート等取り壊し																											取り壊し	



【お知らせ連絡】

・2/2(土)に掘削現場見学会を行いますので、ご希望の方は前日までに電話にてご予約ください(雨天決行)。TEL:077-554-8287 清水建設㈱
また、この見学会は、AとB区画の掘止確認をしていただきますので10時からの開催とさせていただきます。

【工事施工状況写真】 [平成25年1月25日撮影]



B区画掘削状況

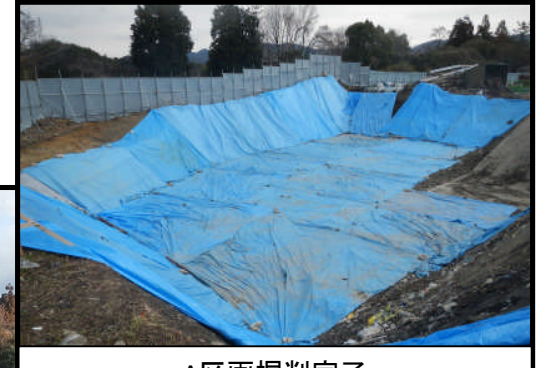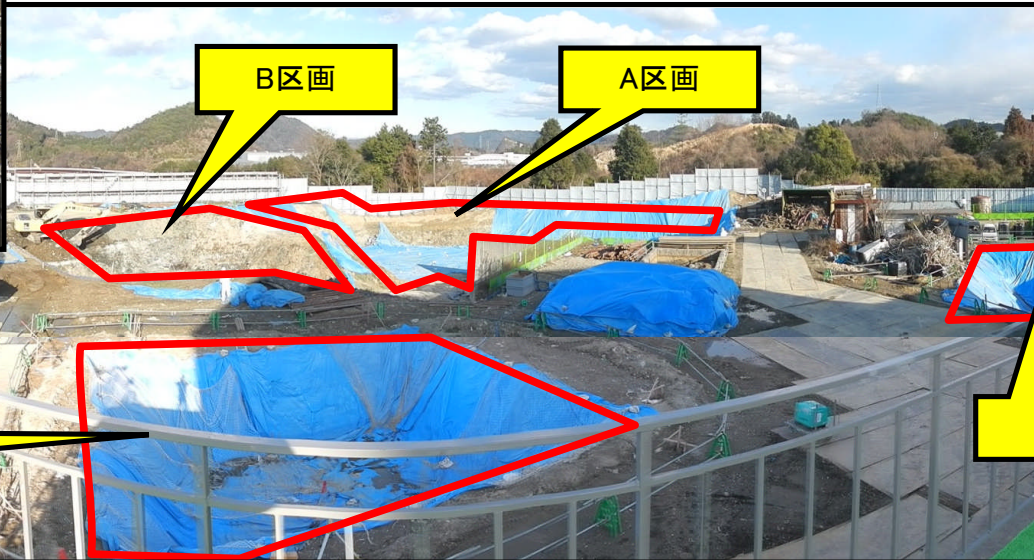

A区画掘削完了



D区画


C区画

騒音・振動・粉じん自動計測の週間結果報告

【自動計測測定位置】

騒音・振動・粉じん自動計測測定は、旧RD敷地境界で行っています。

【自動計測測定位置平面図】

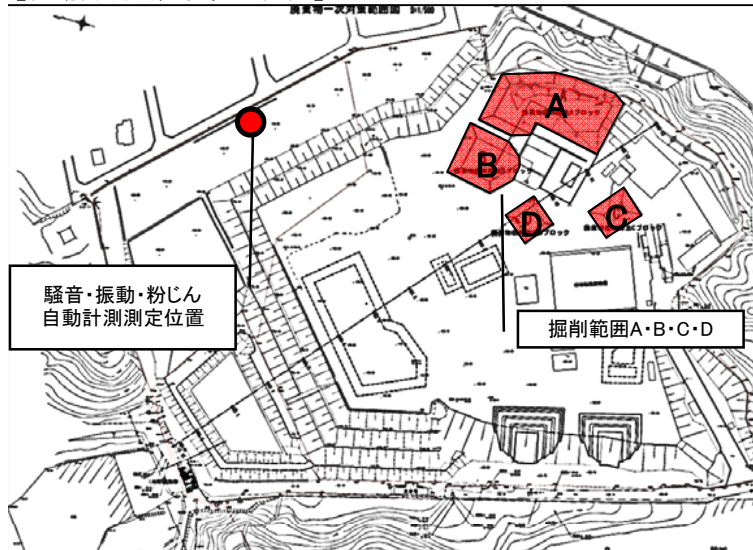

【測定値管理基準】

	騒音	振動	粉じん
第1管理値	基準値の90%	基準値の90%	基準値の90%
第2管理値	基準値	基準値	基準値
基準値	85dB 栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準	75dB 栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準	0.20mg/m ³ 環境省『大気の大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準

【注意】(第1管理値を超過した場合)

作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行う。

【警報】(第2管理値を超過した場合)

直ちに作業を中止し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開する。

